

大飯発電所3、4号機のプラント起動状況について
(7月17日(火)14時時点)

1. 定期検査工程の進捗状況

	4号機	3号機
本日の状況	起動に伴う諸検査 ・1次冷却材系統昇温 ～12:25 ・各種点検・試験	定格熱出力一定運転中
明日の予定	起動に伴う諸検査 ・各種点検・試験 ・原子炉起動 ・臨界操作	定格熱出力一定運転中

添付資料－1：定期検査工程表

2. 発電所の運転状況(パラメータおよび諸検査)

○大飯4号機

- ・プラント状態は異常なし

添付資料－2：大飯4号機運転状況(パラメータ 13時時点)

- ・諸検査の状況

本日の検査実績あり、明日の検査予定あり

添付資料－3：大飯4号機検査一覧表

○大飯3号機：定格熱出力一定運転中

- ・プラント状態は異常なし

添付資料－4：大飯3号機運転状況(パラメータ 13時時点)

- ・諸検査の状況


本日の検査実績なし、明日の検査予定なし

添付資料－5：大飯3号機検査一覧表

3. 特記事項



7月14日(土)に発生した「第二大飯幹線1Lキャリアリレー故障」警報発信についての対応を実施(15:00終了)

大飯発電所3号機、4号機の作業工程

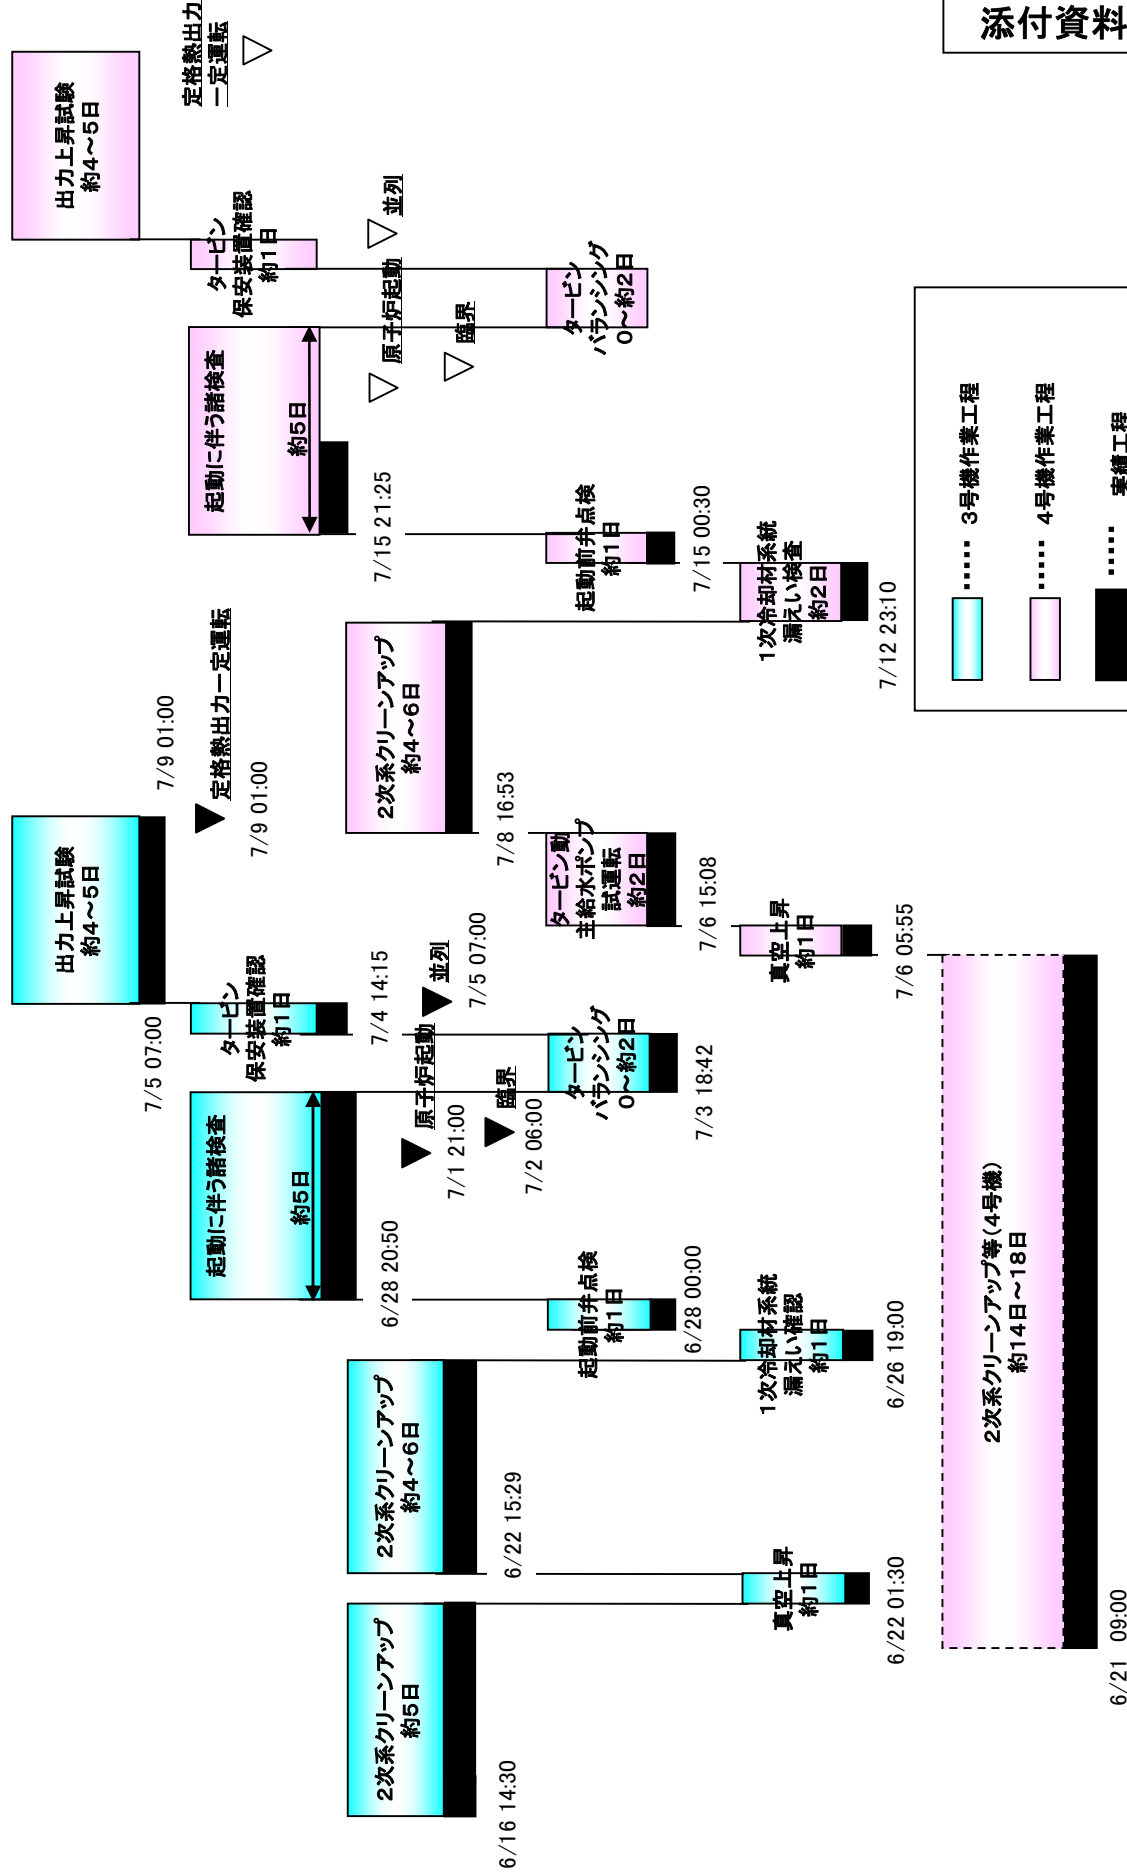

※作業の状況により、工程を変更する場合があります

大飯発電所 4号機 運転パラメータ (平成24年7月17日13:00時点)

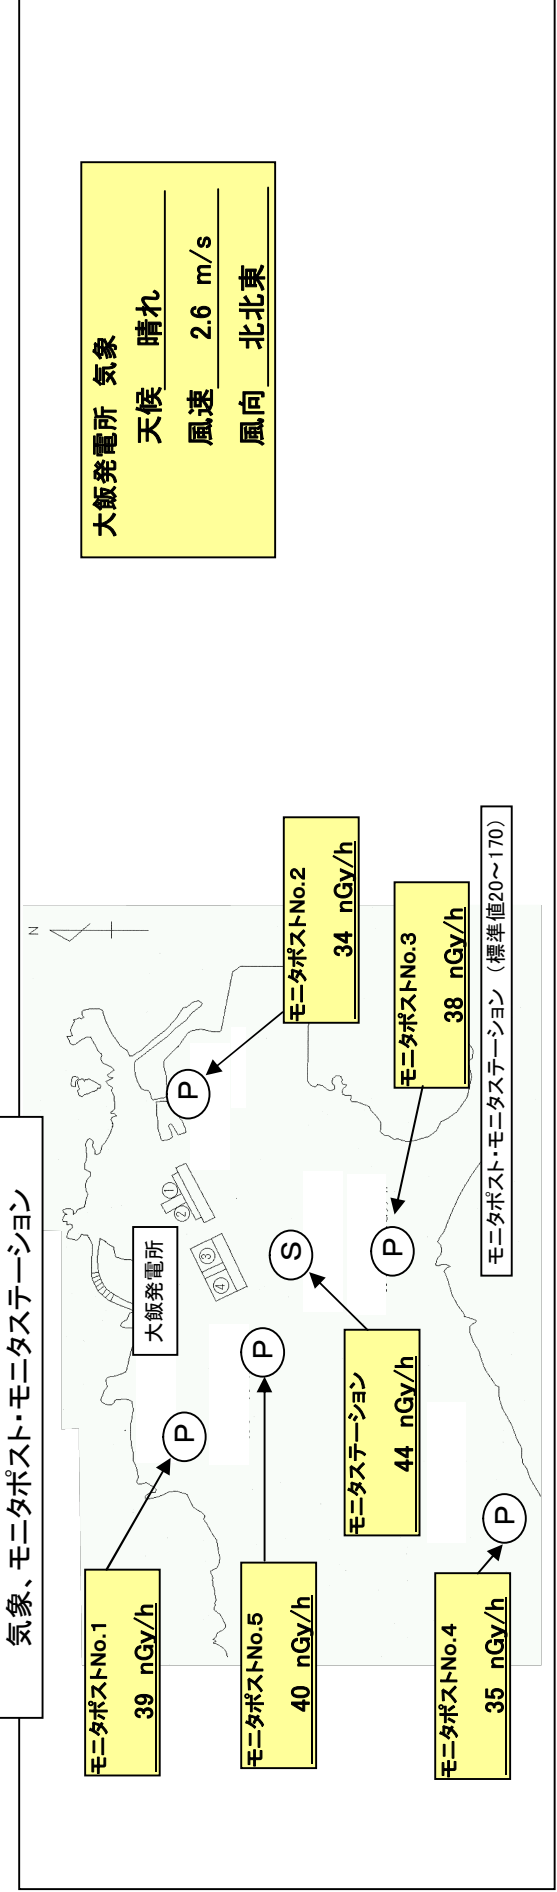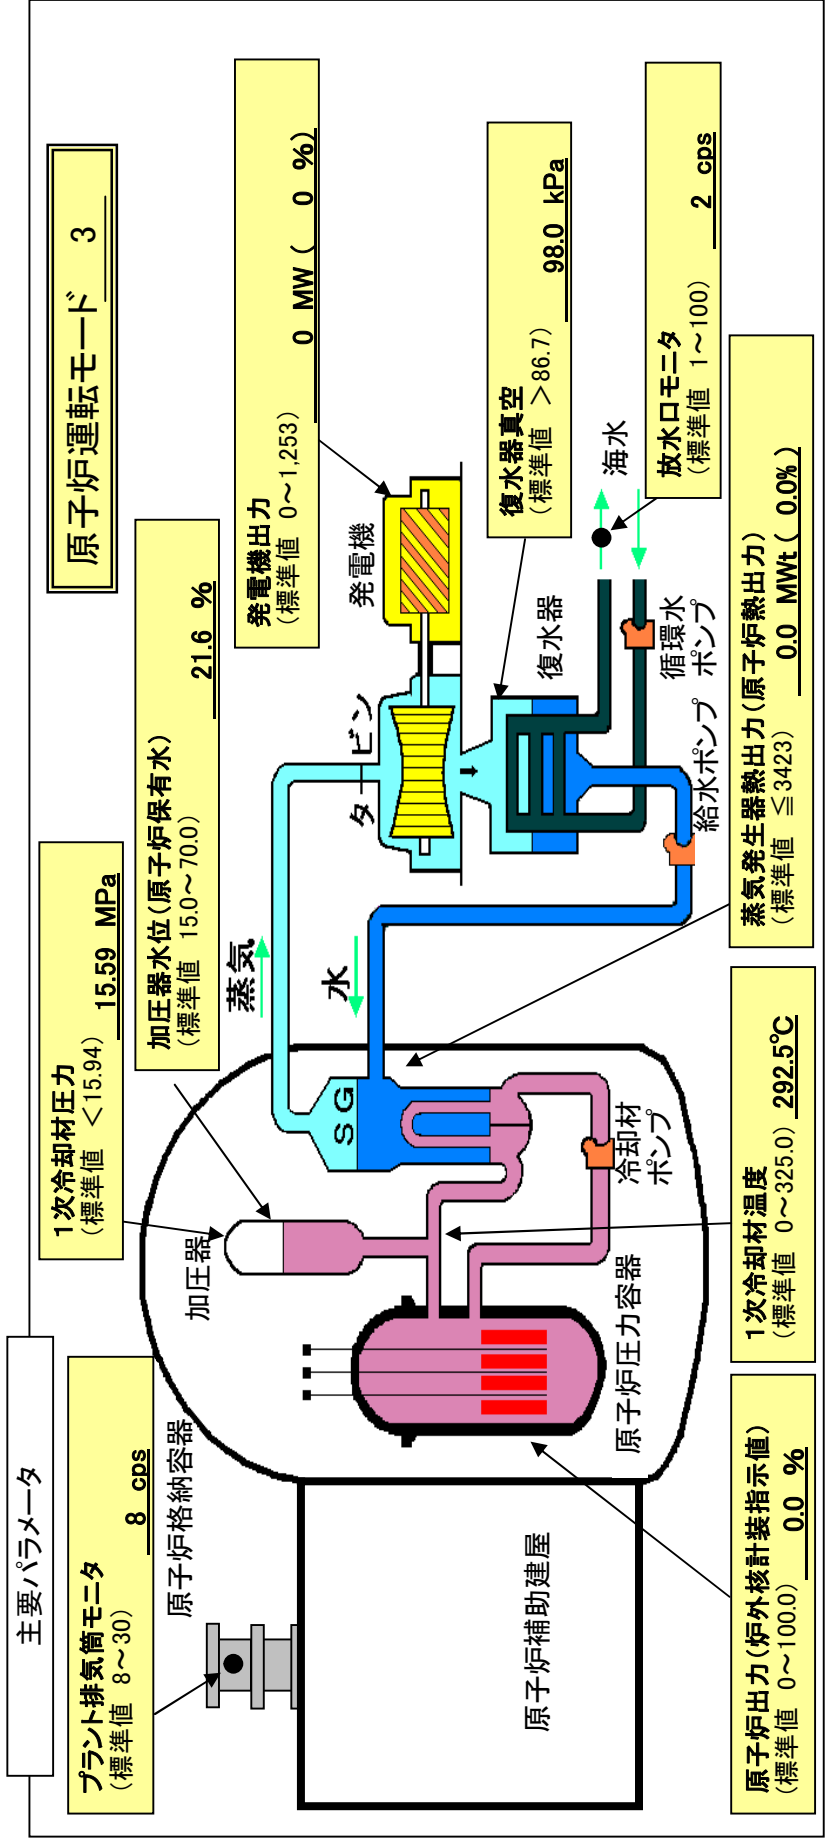

大飯4号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転まで) [7/17(火)]

<定期事業者検査(事業者が実施)>

定期検査対象	検査名	完了状況(※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆	制御棒駆動系機能検査				○
☆	主蒸気安全弁機能検査	全完		○	
☆	蒸気タービン性能検査	一部完了			
☆	クラス1機器供用期間中検査	一部完了		○	
☆	蒸気タービン性能検査(タービン過速度トリップ試験)				
☆	加圧器逃がし弁漏えい検査				○
☆	補助給水系機能検査	一部完了			○
☆	原子炉停止余裕検査				
☆	安全保護系設定値確認検査	一部完了			
☆	制御用空気圧縮系機能検査	全完			
☆	蒸気タービン開放検査	全完			
	炉物理検査				○
	構造健全性検査	一部完了		○	
	1次冷却材ポンプ機能検査			○	
	核計装設備検査	一部完了			○
	計測制御系機能検査	一部完了	○		
	計測制御系監視機能検査	一部完了			
	放射線監視装置機能検査	一部完了			
	2次系配管検査	一部完了		○	
	2次系ポンプ機能検査	全完			
	総合インターロック検査	全完			
	制御棒位置指示装置設定値検査	全完			


<使用前検査(国が実施)>

検査名	完了状況(※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
加圧器管台他補修工事(イ)使用前検査	全完			

※1: 定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。

※2: 昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。

大飯発電所 3号機 運転パラメータ (平成24年7月17日13:00時点)

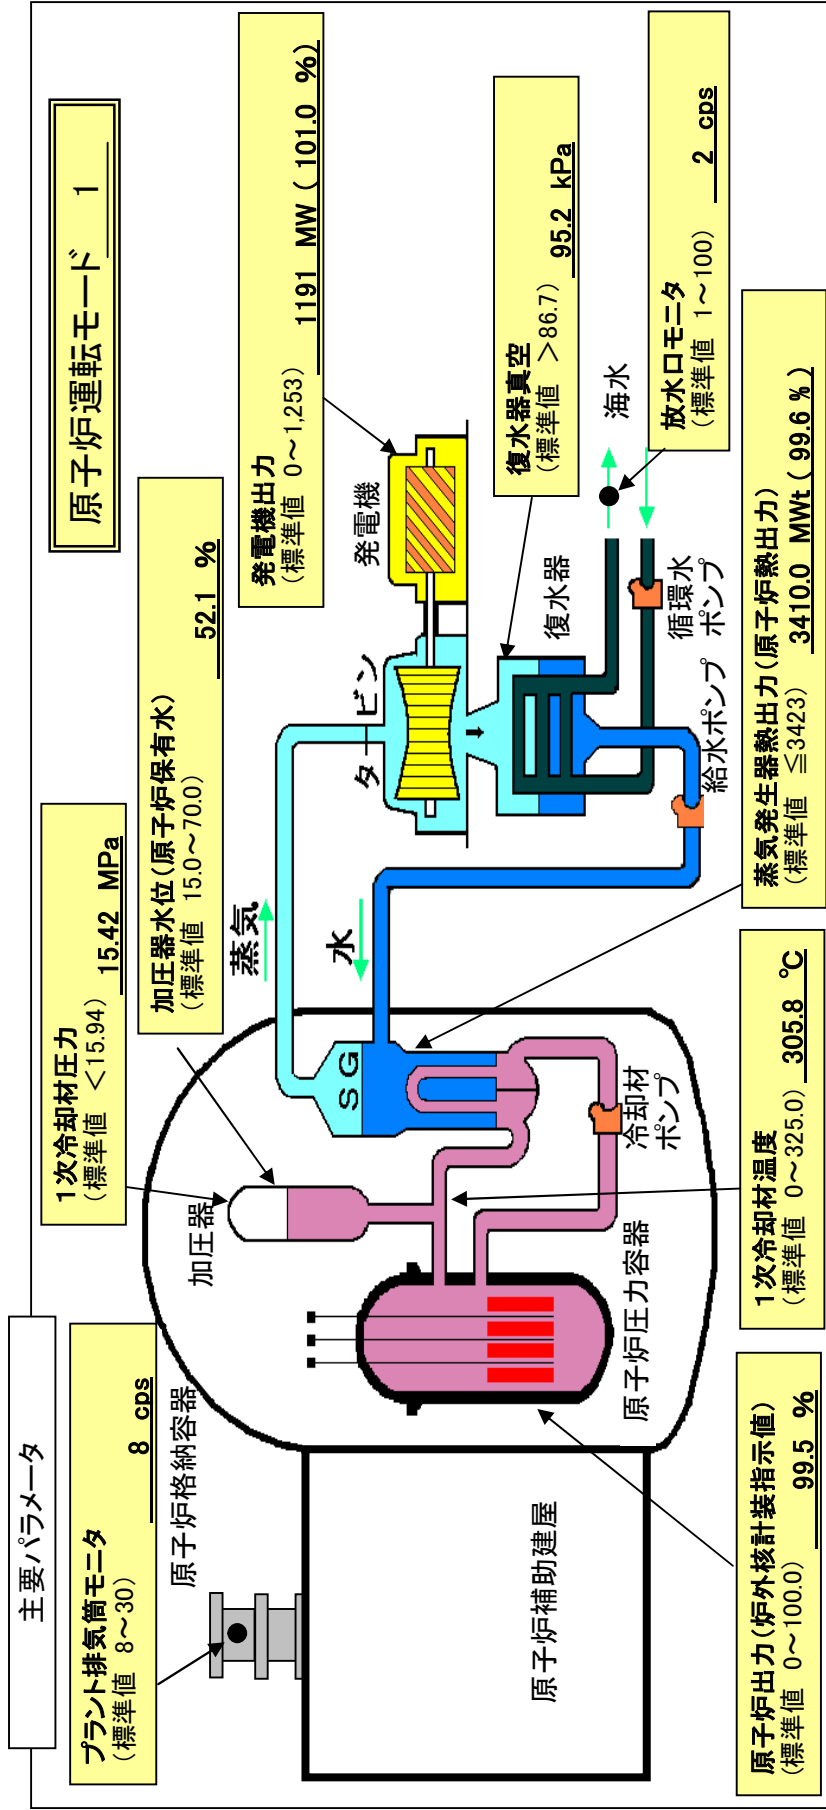

大飯3号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転以降) [7/17(火)]

＜定期事業者検査(事業者が実施)＞

定期検査 対象	検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆	総合負荷性能検査				
☆	安全保護系設定値確認検査	全完			
	炉物理検査	全完			
	1次冷却材ポンプ機能検査	全完			
	核計装設備検査	全完			
	計測制御系機能検査	全完			
	計測制御系監視機能検査	全完			
	放射線監視装置機能検査	全完			
	2次系配管検査	全完			
	液体廃棄物処理系機能検査	一部 完了			
	蒸気タービン附属設備機能検査				

＜使用前検査(国が実施)＞

検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
蒸気タービン改造工事(木)使用前検査				
加圧器管台他補修工事(木)使用前検査				

※1: 定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。

※2: 昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。
