


大飯発電所3、4号機のプラント運転状況について (7月26日(木)13時時点)

1. 発電所の運転状況

3号機	4号機
定格熱出力一定運転中	定格熱出力一定運転中

2. 運転パラメータ

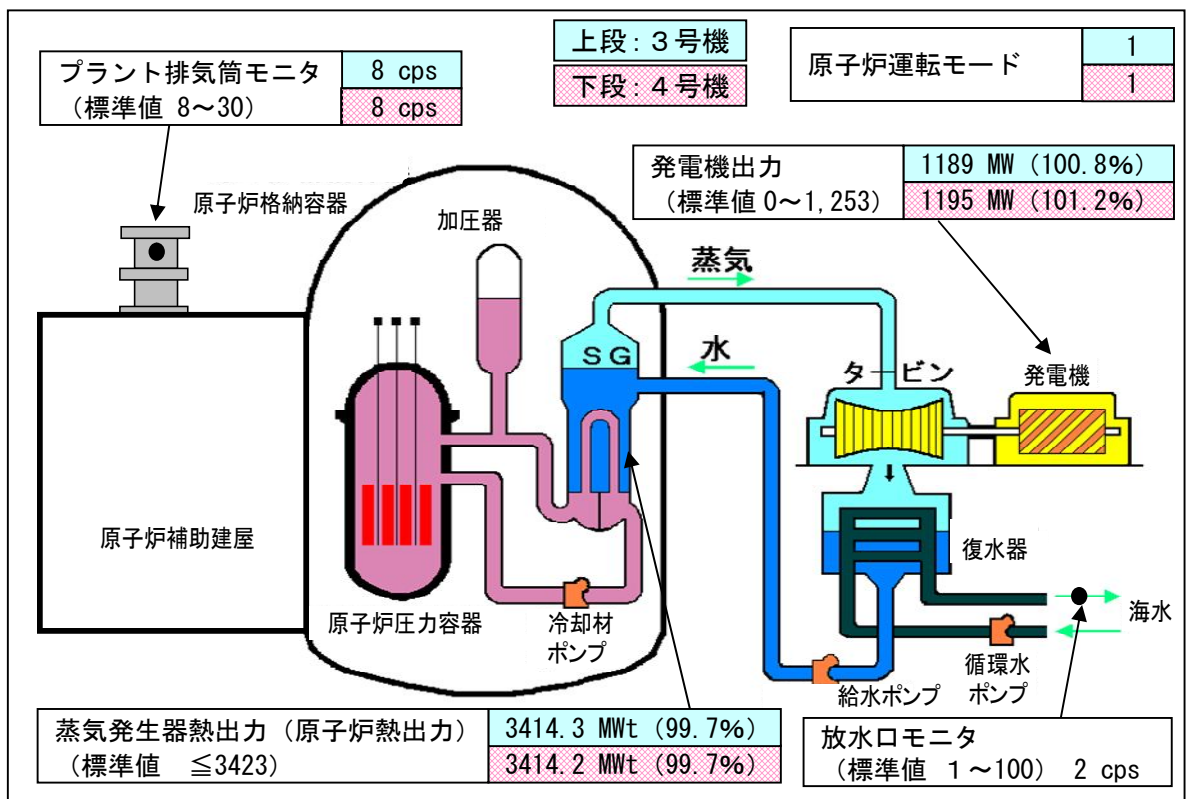

3. 諸検査の状況

3号機	4号機
今後の検査予定 ・総合負荷性能検査 8/3 ・蒸気タービン改造工事(木)使用前検査 8/3 ・加圧器管台他補修工事(木)使用前検査 8/3	添付資料-1: 大飯4号機検査一覧表

4. 特記事項

- (1) 7月25日(水)発生した大飯4号機「1次冷却材飽和温度注意」警報発信についての対応を実施
- (2) 7月25日(水)に発生した大飯4号「安全系GC負荷トリップ」警報発信についての対応を実施(17:01~17:06ターニングを実施:異常なし)

大飯4号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転以降) [7/26(木)]

＜定期事業者検査(事業者が実施)＞

定期検査 対象	検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	7/27~ 8/2
☆	総合負荷性能検査				
☆	安全保護系設定値確認検査	一部 完了			○ ^(注)
	炉物理検査	一部 完了			○
	1次冷却材ポンプ機能検査	全完		○	
	核計装設備検査	全完	○		
	計測制御系機能検査	一部 完了			○
	計測制御系監視機能検査	一部 完了			○ ^(注)
	放射線監視装置機能検査	一部 完了			○
	2次系配管検査	一部 完了			○
	蒸気タービン附属設備機能検査				

(注) 定格熱出力一定運転以降に確認するデータ結果により、設定値の変更が不要な場合は当該検査は実施しない。

＜使用前検査(国が実施)＞

検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	7/27~ 8/2
蒸気タービン改造工事(ホ)使用前検査				
加圧器管台他補修工事(ホ)使用前検査				

※1: 定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。

※2: 昨日、本日、来週木曜日までの検査実施日、予定のある場合に「○」を記載。
