

大飯発電所3、4号機のプラント起動状況について
(6月27日(水)14時時点)

1. 定期検査工程の進捗状況

	3号機	4号機
本日の状況	1次冷却材系統漏えい確認	2次系クリーンアップ等 ・タービン主要弁調整
明日の予定	起動前弁点検 起動に伴う諸検査 ・1次冷却材系統昇温 ・各種点検・試験	2次系クリーンアップ等 ・タービン主要弁調整 ・復水器水張り

添付資料－1：定期検査工程表

2. 発電所の運転状況(パラメータ)

プラント状態は異常なし

添付資料－2：大飯3号機運転状況(パラメータ 13時時点)

大飯4号機運転状況(パラメータ 13時時点)

3. 諸検査の状況

本日の検査実績なし


明日の検査予定あり

添付資料－3：検査一覧表

4. 特記事項



3号機「C直流地絡」警報発信についての原因を調査中。

大飯発電所3号機、4号機の作業工程

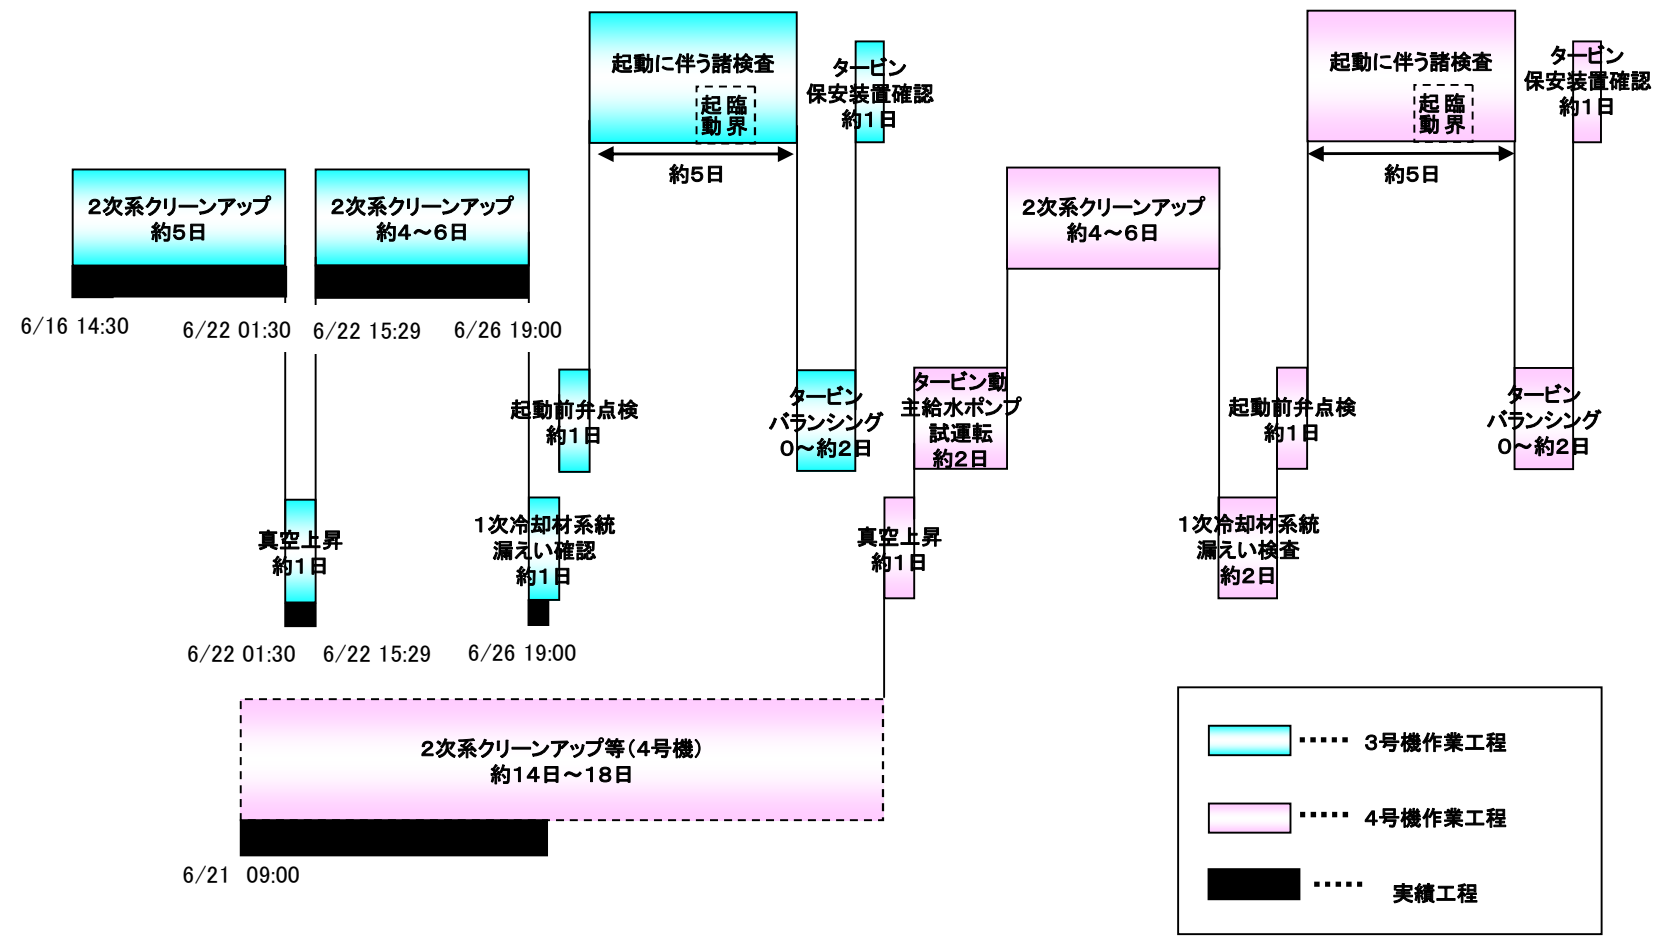


※作業の状況により、工程を変更する場合があります

大飯発電所 3号機 運転パラメータ (平成24年6月27日13:00時点)

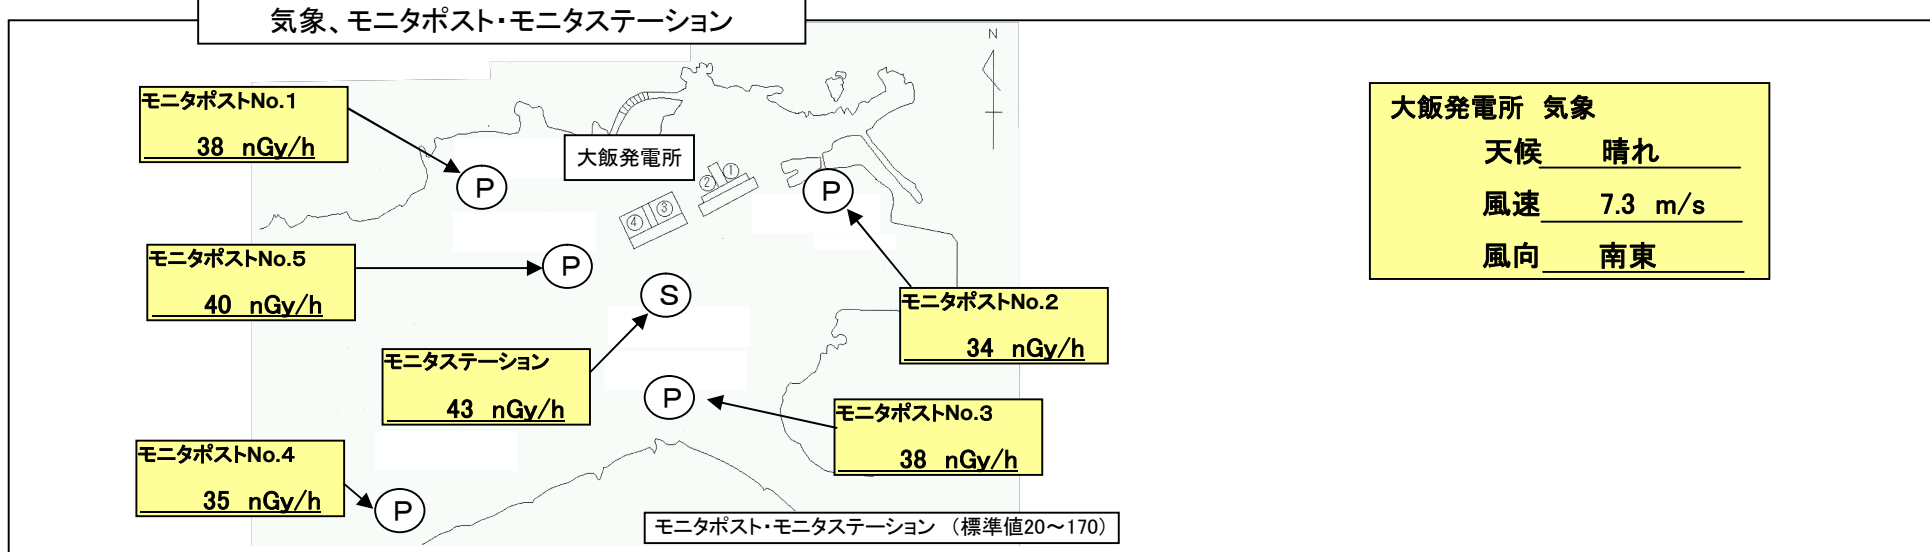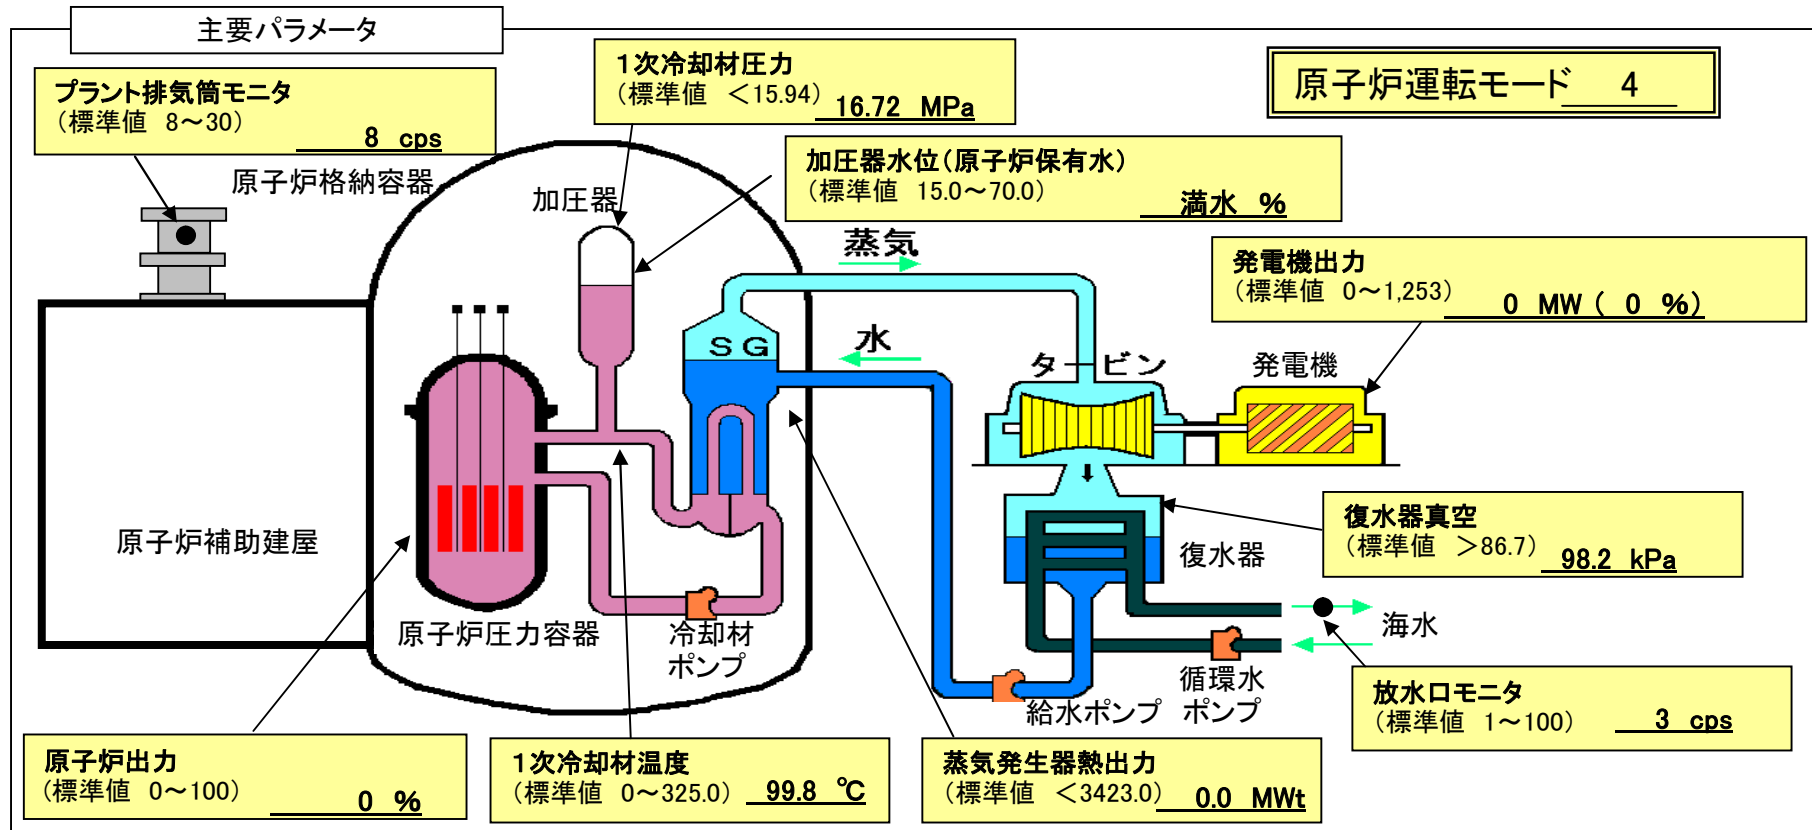

大飯発電所 4号機 運転パラメータ (平成24年6月27日13:00時点)

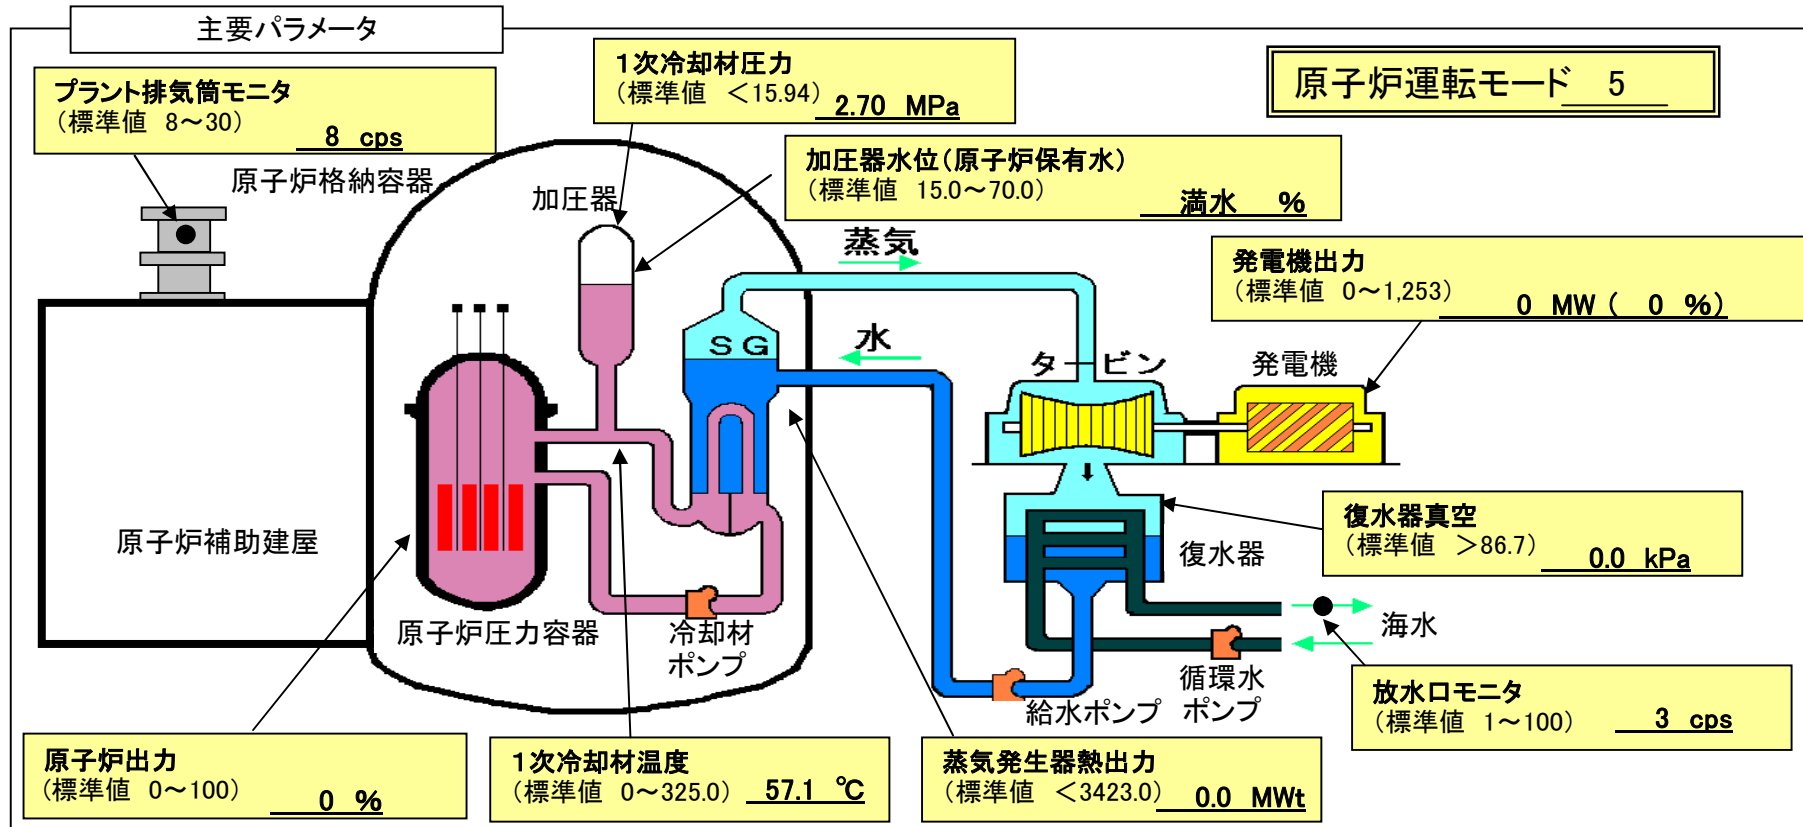

大飯3号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転まで) [6/27(水)]

<定期事業者検査(事業者が実施)>

定期検査 対象	検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆	制御棒駆動系機能検査				
☆	主蒸気安全弁機能検査				
☆	蒸気タービン性能検査				
☆	クラス1機器供用期間中検査				
☆	蒸気タービン性能検査(タービン過速度トリップ試験)				
☆	加圧器逃がし弁漏えい検査				
☆	補助給水系機能検査				
☆	原子炉停止余裕検査				
☆	安全保護系設定値確認検査				
	炉物理検査				
	構造健全性検査				
	1次冷却材ポンプ機能検査				
	核計装設備検査				
	計測制御系機能検査				
	計測制御系監視機能検査				
	放射線監視装置機能検査	一部 完了	○		

<使用前検査(国が実施)>

検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
ーなしー				

※1: 定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。
 ※2: 昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。

大飯4号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転まで) [6/27(水)]

<定期事業者検査(事業者が実施)>

定期検査対象	検査名	完了状況(※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆	制御棒駆動系機能検査				
☆	主蒸気安全弁機能検査				
☆	蒸気タービン性能検査				
☆	クラス1機器供用期間中検査				
☆	蒸気タービン性能検査(タービン過速度トリップ試験)				
☆	加圧器逃がし弁漏えい検査				
☆	補助給水系機能検査				
☆	原子炉停止余裕検査				
☆	安全保護系設定値確認検査				
☆	制御用空気圧縮系機能検査				
☆	蒸気タービン開放検査				
	炉物理検査				
	構造健全性検査				
	1次冷却材ポンプ機能検査				
	核計装設備検査				
	計測制御系機能検査				
	計測制御系監視機能検査				○
	放射線監視装置機能検査				
	2次系配管検査				
	2次系ポンプ機能検査				
	総合インターロック検査				
	制御棒位置指示装置設定値検査				

<使用前検査(国が実施)>

検査名	完了状況(※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
加圧器管台他補修工事(イ)使用前検査				

※1: 定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。
 ※2: 昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。
