

高浜発電所1号機の状態について（お知らせ）


2023年7月27日
 関西電力株式会社

	内 容
実績 〔 7月26日 9時 ~ 7月27日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・起動試験実施中（7月21日開始） ○2次系（タービン関係） ・なし [検査関係] ○定期事業者検査 ・7月26日 補助給水系機能検査 ・7月26日 1次系換気空調設備検査 ○使用前検査 ・なし
予定 〔 7月27日 9時 ~ 7月28日 9時 〕	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（7月21日開始） ○2次系（タービン関係） ・なし [検査関係] ○定期事業者検査 ・制御棒駆動系機能検査 ・放射線監視装置機能検査 ・1次冷却材ポンプ機能検査 ○使用前検査 ・なし

高浜発電所1号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.7.27 9:00時点

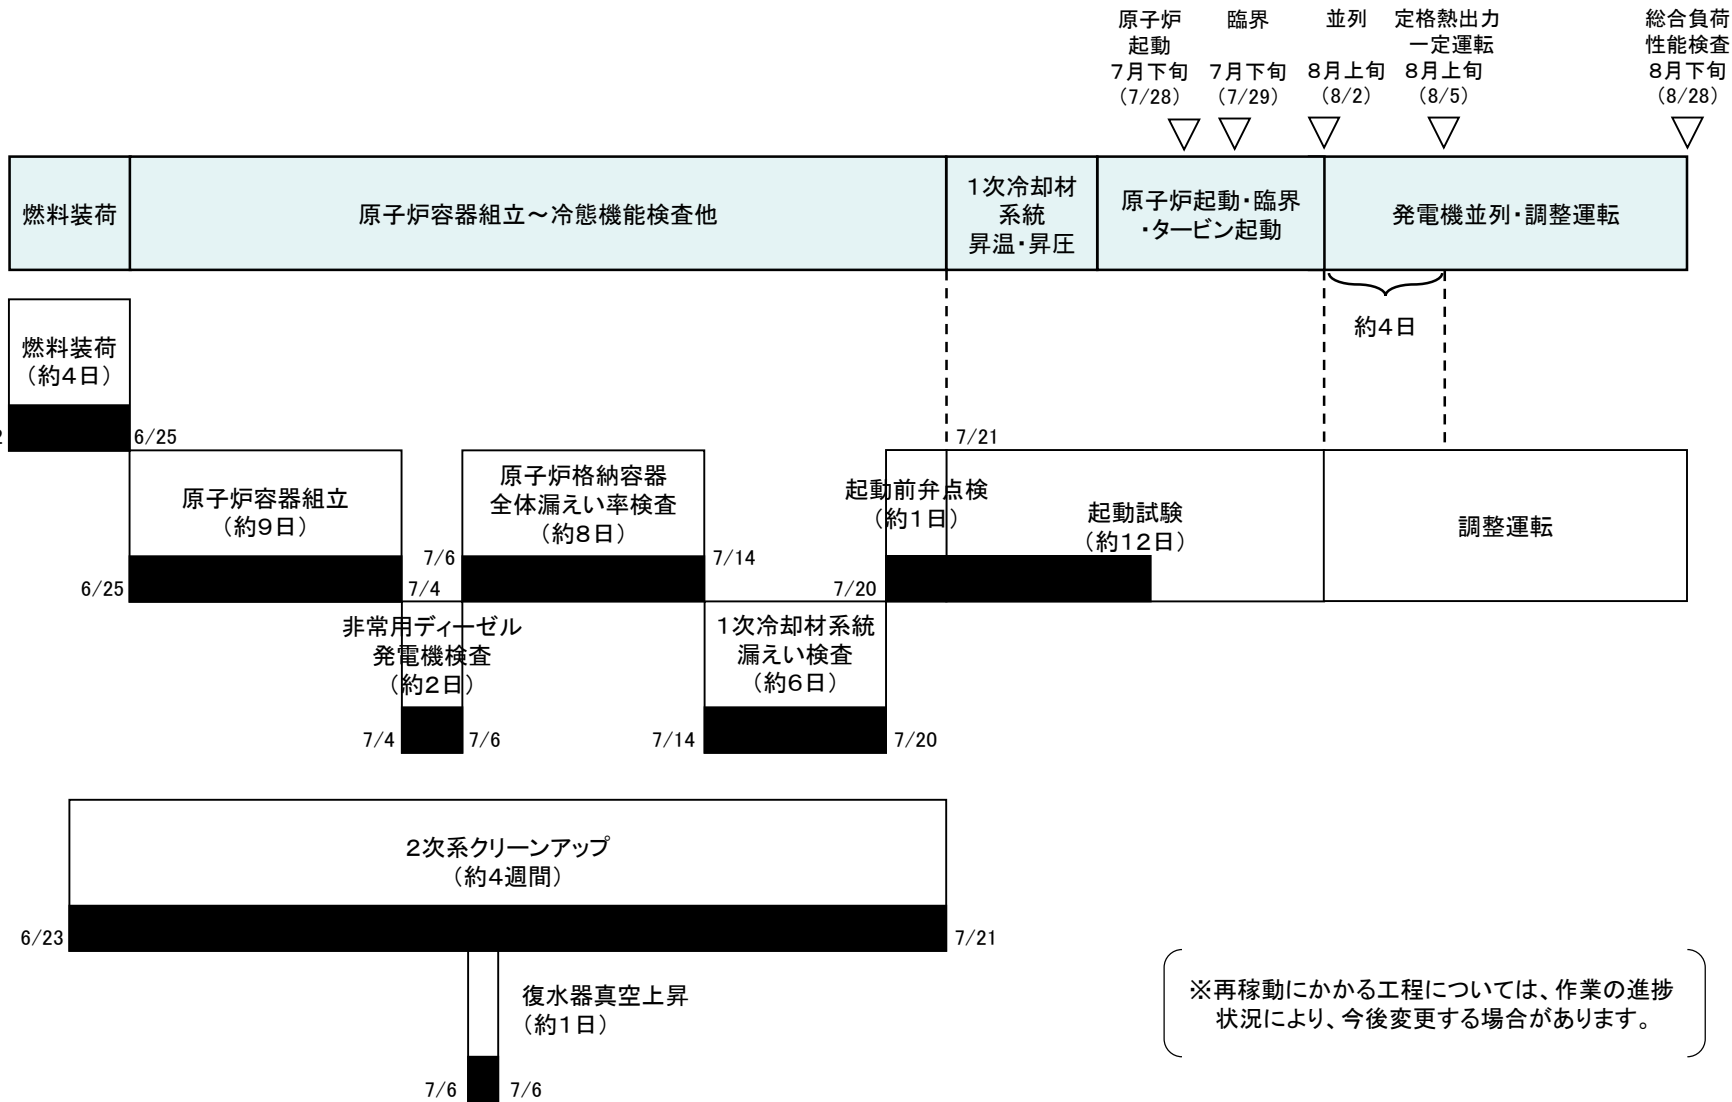

※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注: 黒塗りは実績を示す

