

大飯発電所3、4号機のプラント起動状況について  
(7月25日(水)14時時点)

## 1. 定期検査工程の進捗状況

	4号機	3号機
本日の状況	出力上昇試験 ・出力上昇試験 ~01:00 定格熱出力一定運転 01:00~	定格熱出力一定運転中
明日の予定	定格熱出力一定運転中	定格熱出力一定運転中

添付資料-1:定期検査工程表

## 2. 発電所の運転状況(パラメータおよび諸検査)

○大飯4号機: 定格熱出力一定運転中

- ・プラント状態は異常なし

添付資料-2:大飯4号機運転状況(パラメータ 13時時点)

- ・諸検査の状況

本日の検査実績あり、明日の検査予定あり

添付資料-3:大飯4号機検査一覧表

○大飯3号機: 定格熱出力一定運転中

- ・プラント状態は異常なし

添付資料-4:大飯3号機運転状況(パラメータ 13時時点)

- ・諸検査の状況


本日の検査実績あり、明日の検査予定なし

添付資料-5:大飯3号機検査一覧表

## 3. 特記事項


大飯4号機で5時27分に発生した「1次冷却材飽和温度注意」警報発信  
についての対応を実施中

# 大飯発電所3号機、4号機の作業工程

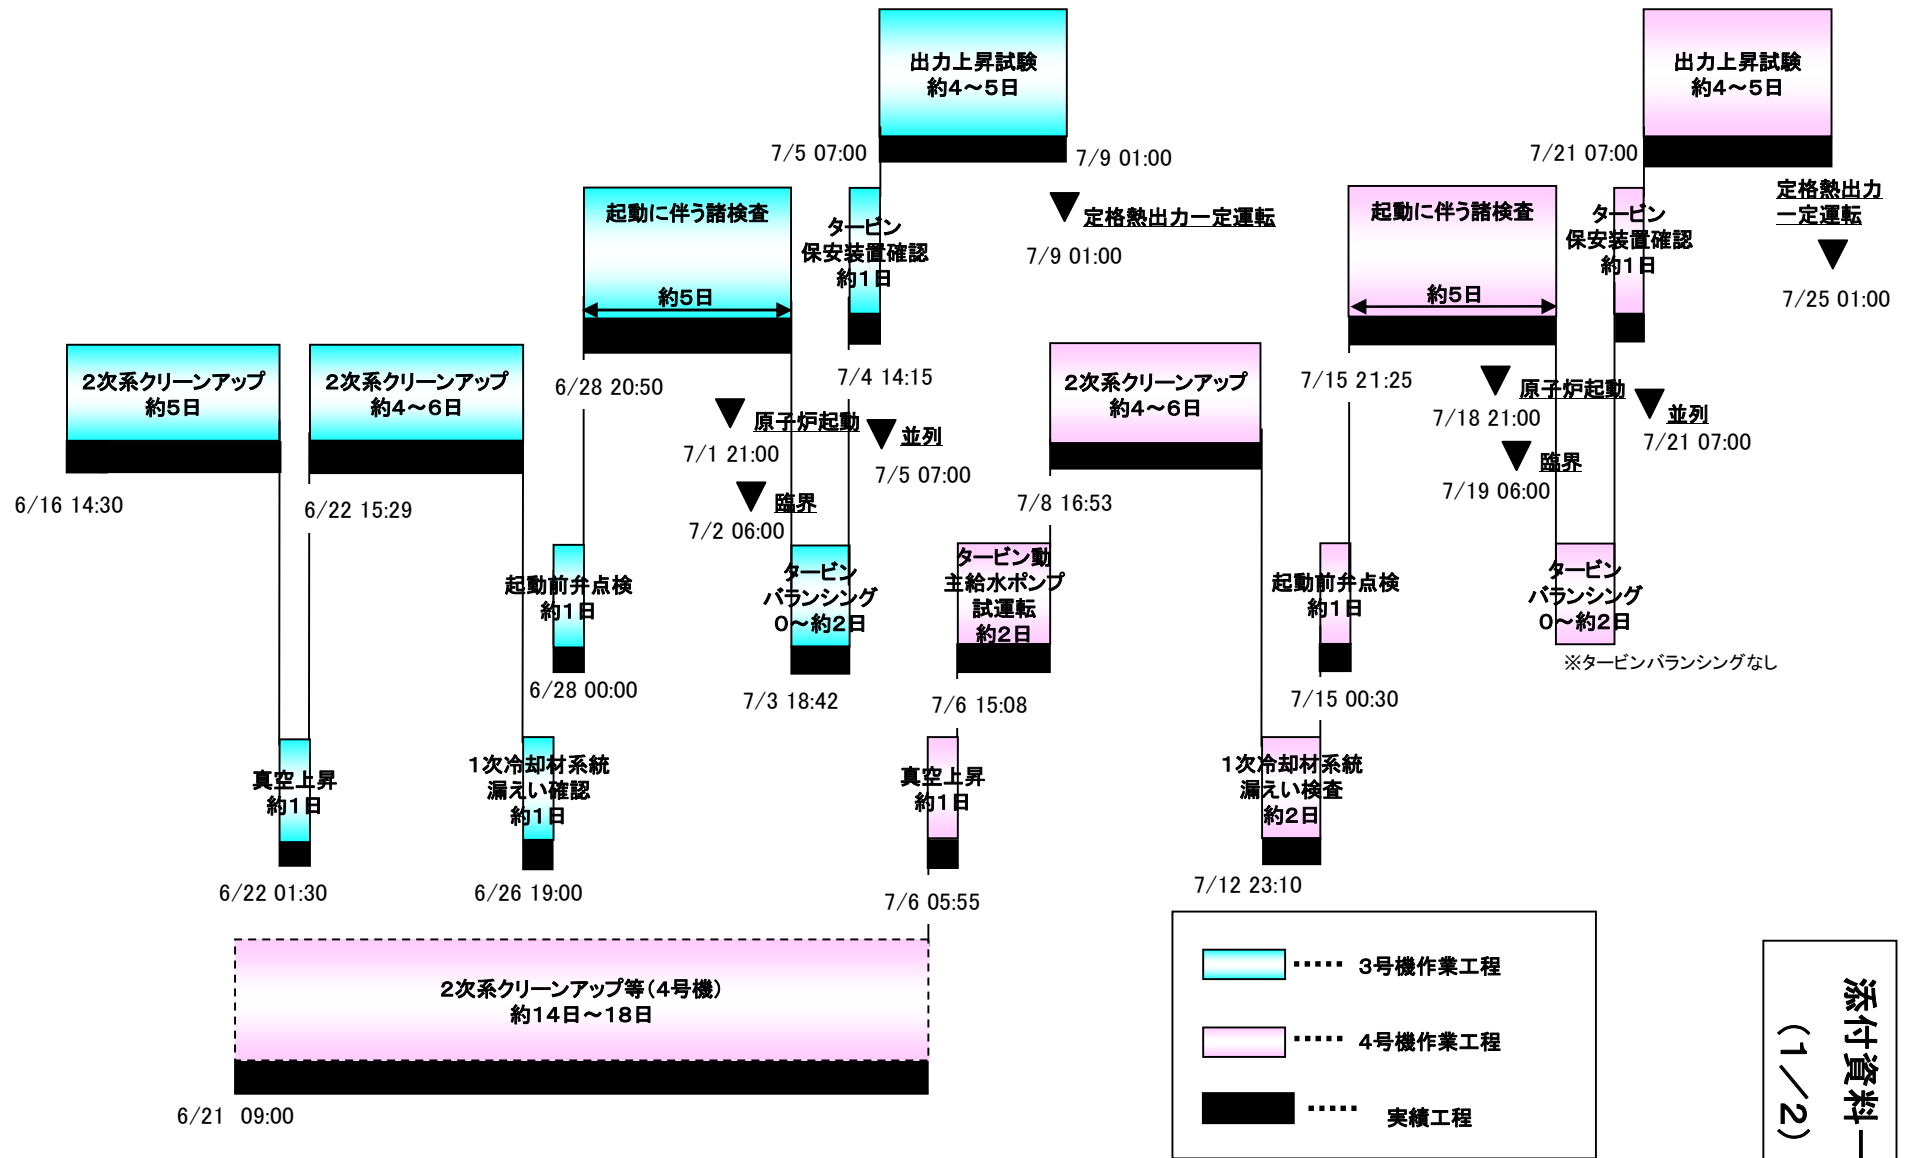

※作業の状況により、工程を変更する場合があります



# 大飯発電所4号機 発電機出力上昇工程

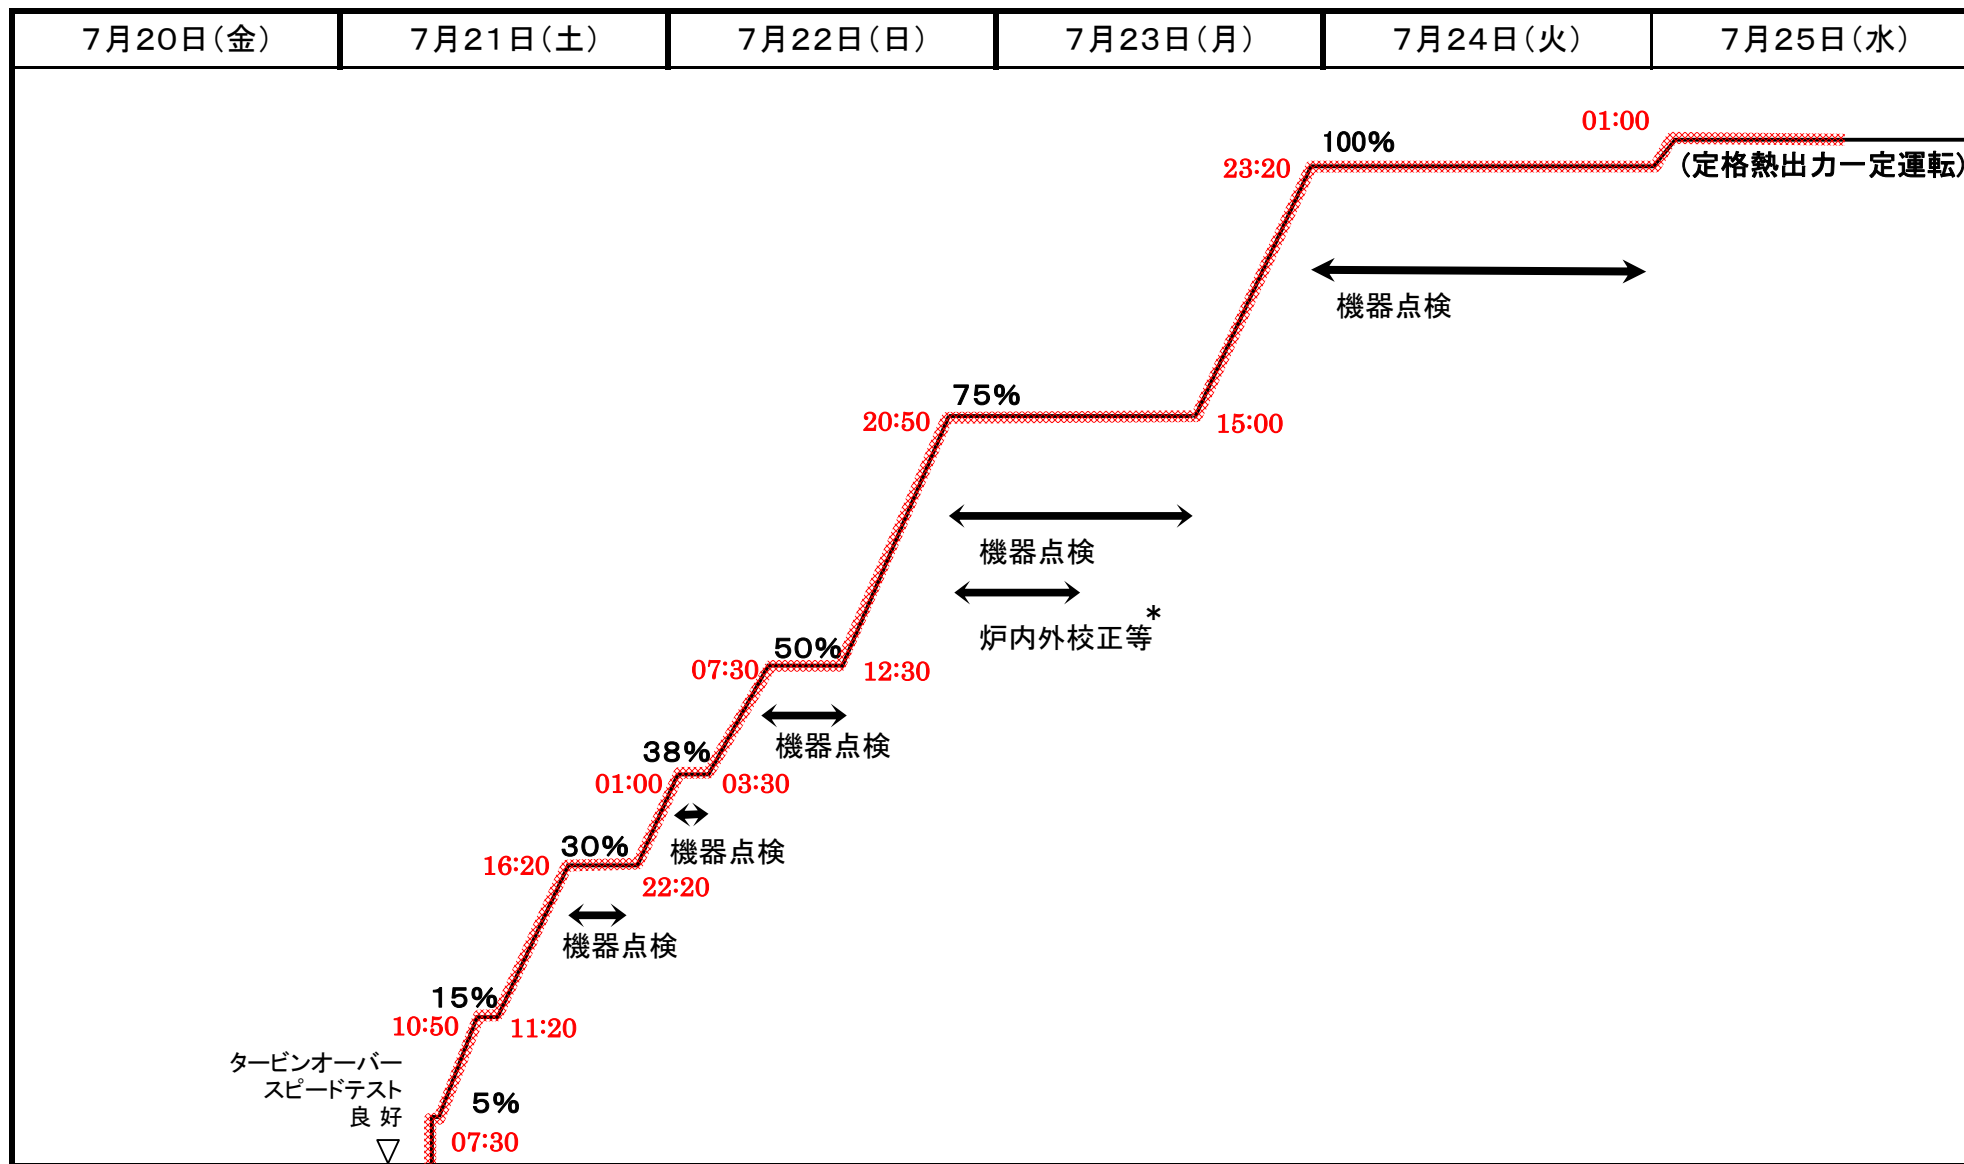

発電機並列  
07:00

\* : 炉内の出力分布と炉外核計測装置が測定している電流値との相関関係を解析し、解析に基づき炉外核計測装置の校正を行う

大飯発電所 4号機 運転パラメータ (平成24年7月25日13:00時点)

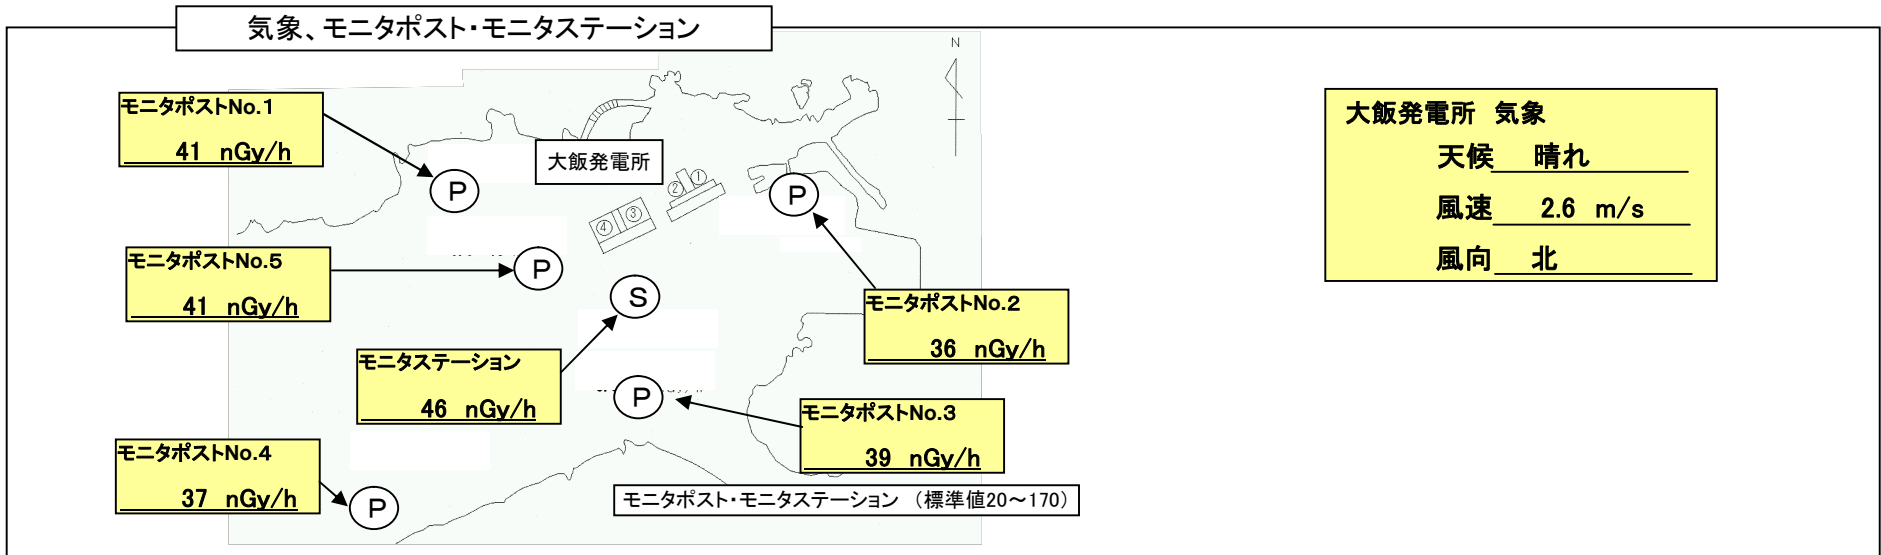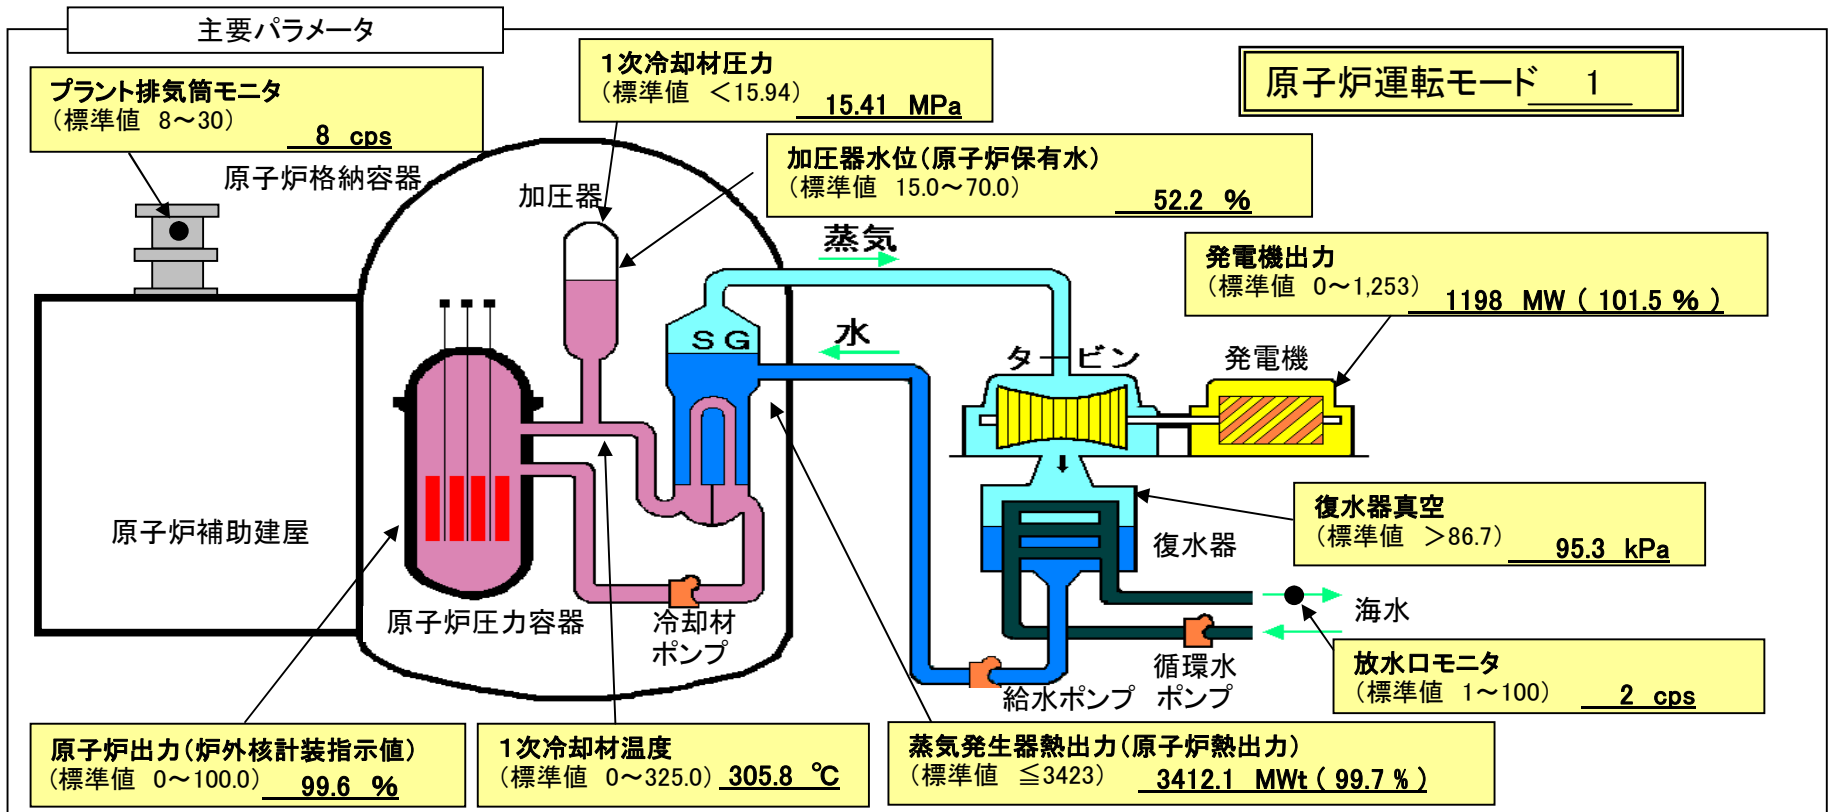

## 大飯4号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転以降) [7/25(水)]

## &lt;定期事業者検査(事業者が実施)&gt;

定期検査 対象	検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆	総合負荷性能検査				
☆	安全保護系設定値確認検査	一部 完了			
	炉物理検査	一部 完了			
	1次冷却材ポンプ機能検査	一部 完了			○
	核計装設備検査	一部 完了		○	
	計測制御系機能検査	一部 完了			
	計測制御系監視機能検査	一部 完了			
	放射線監視装置機能検査	一部 完了			
	2次系配管検査	一部 完了			
	蒸気タービン附属設備機能検査				


## &lt;使用前検査(国が実施)&gt;

検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
蒸気タービン改造工事(木)使用前検査				
加圧器管台他補修工事(木)使用前検査				

※1: 定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。

※2: 昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。

大飯発電所 3号機 運転パラメータ (平成24年7月25日13:00時点)

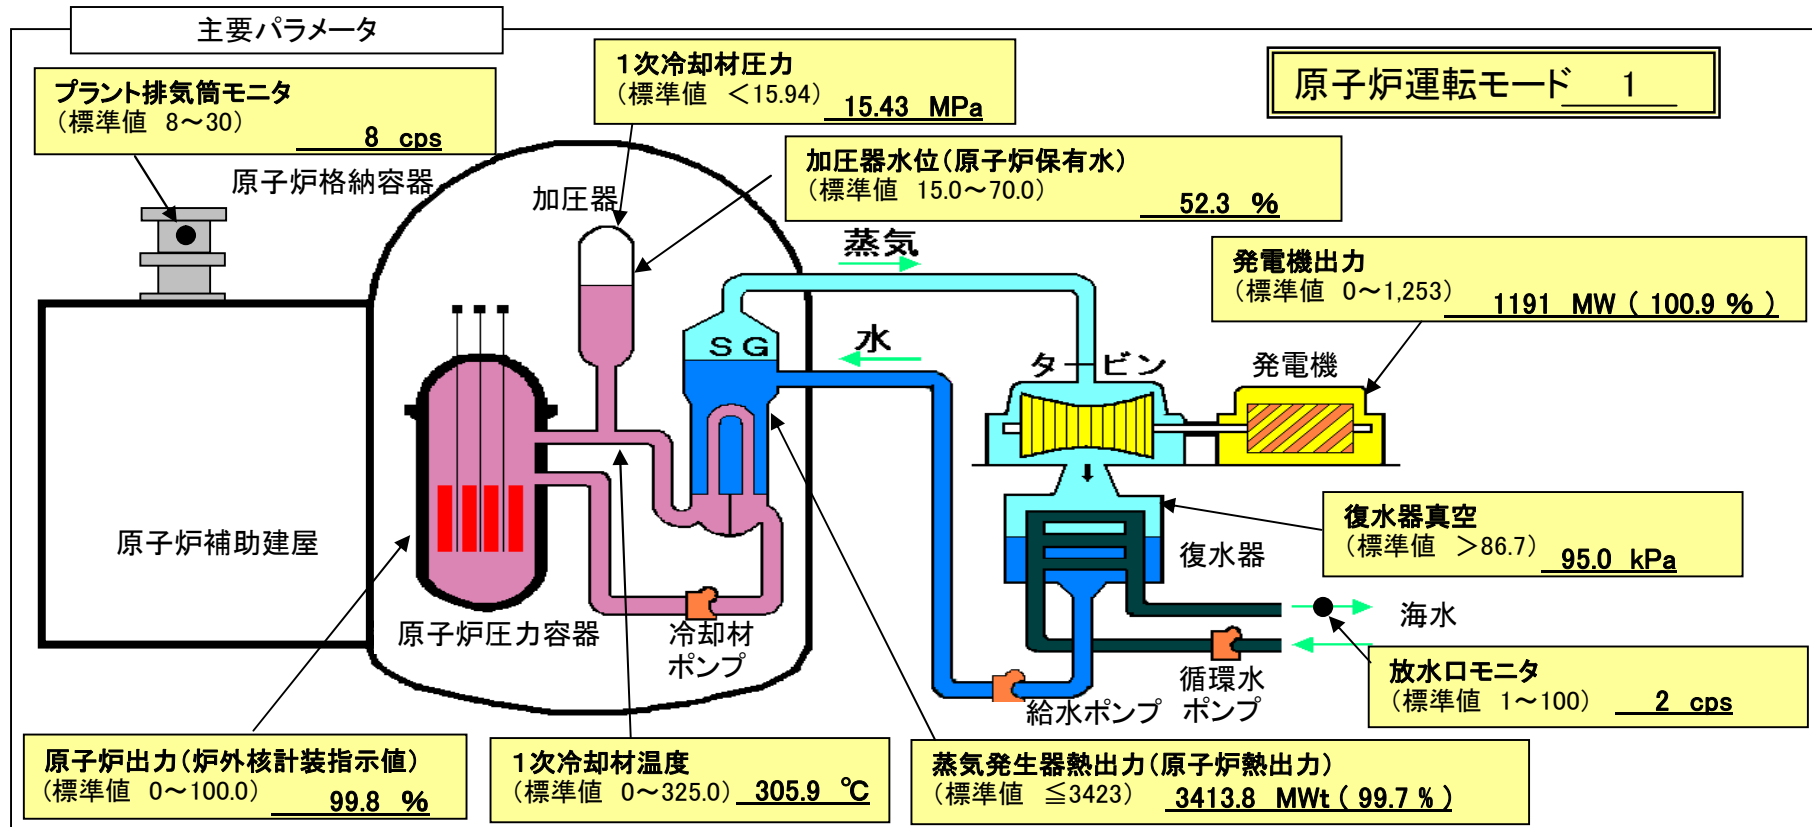

## 大飯3号機 検査一覧表(定格熱出力一定運転以降) [7/25(水)]

## &lt;定期事業者検査(事業者が実施)&gt;

定期検査 対象	検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
			昨日	本日	明日
☆	総合負荷性能検査				
☆	安全保護系設定値確認検査	全完			
	炉物理検査	全完			
	1次冷却材ポンプ機能検査	全完			
	核計装設備検査	全完			
	計測制御系機能検査	全完			
	計測制御系監視機能検査	全完			
	放射線監視装置機能検査	全完			
	2次系配管検査	全完			
	液体廃棄物処理系機能検査	一部 完了	○	○	
	蒸気タービン附属設備機能検査	全完			

## &lt;使用前検査(国が実施)&gt;

検査名	完了 状況 (※1)	検査実施状況(※2)		
		昨日	本日	明日
蒸気タービン改造工事(木)使用前検査				
加圧器管台他補修工事(木)使用前検査				

※1:定期事業者検査の全項目が完了した検査は「全完」、検査を継続するものは「一部完了」と記載。

※2:昨日から明日にかけて、検査実施日に「○」を記載。
