

### 高浜発電所 1号機の状況について（週報）

2023年6月23日  
 関西電力株式会社

	内 容
実績 [ 6月22日 ~ 6月23日 9時 ]	<b>[主要工程]</b> ○1次系（原子炉関係） ・6月22日 燃料装荷開始  <b>[検査関係]</b> ・なし
予定 [ 6月23日 9時 ~ 6月30日 9時 ]	<b>[主要工程]</b> ○1次系（原子炉関係） ・燃料装荷（6月22日開始） ・原子炉容器組立 ○2次系（タービン関係） ・2次系クリーンアップ※  <b>[検査関係]</b> ○定期事業者検査 ・燃料集合体炉内配置検査 ・主蒸気隔離弁機能検査 等  ○使用前検査 ・なし

※ 2次系主管系統（給水、復水系統等）の不純物（鉄、ナトリウム、塩素等）を、系統内に水を循環させて取り除くこと


# 高浜発電所1号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料

2023.6.23 9:00時点


6/23時点

原子炉 起動 7月下旬 (7/28)	臨界 7月下旬 (7/29)	並列 8月上旬 (8/2)	定格熱出力 一定運転 8月上旬 (8/5)	総合負荷 性能検査 8月下旬 (8/28)
▽	▽	▽	▽	▽




約4日

6/22

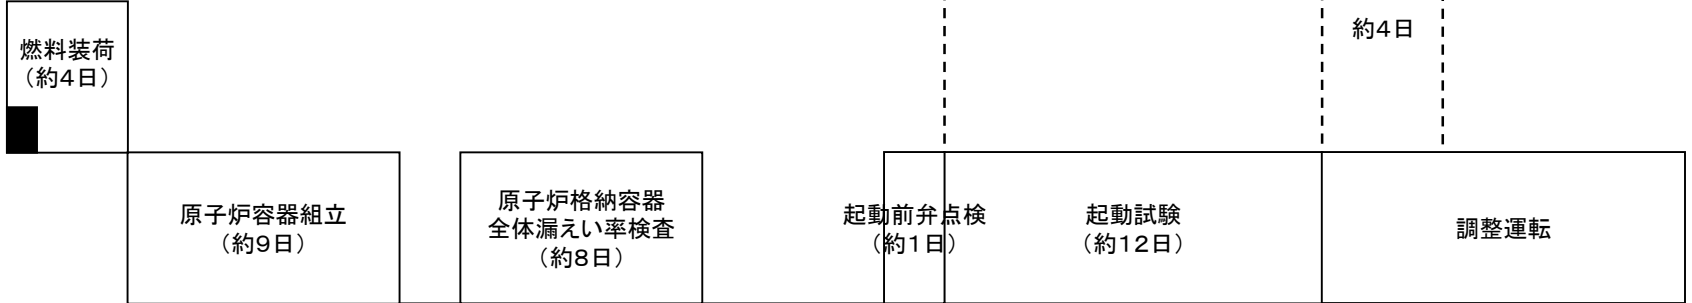

非常用ディーゼル  
発電機検査  
(約2日)

1次冷却材系統  
漏えい検査  
(約6日)



復水器真空上昇  
(約1日)

※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。
