


高浜発電所協力会社作業員の計画線量超過について

発生場所


原子炉格納容器平面図
(上から見た図)

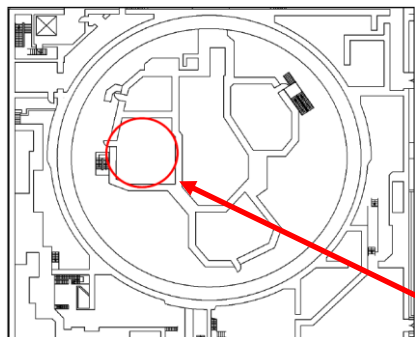

発生場所
(Aループ室)



(拡大)

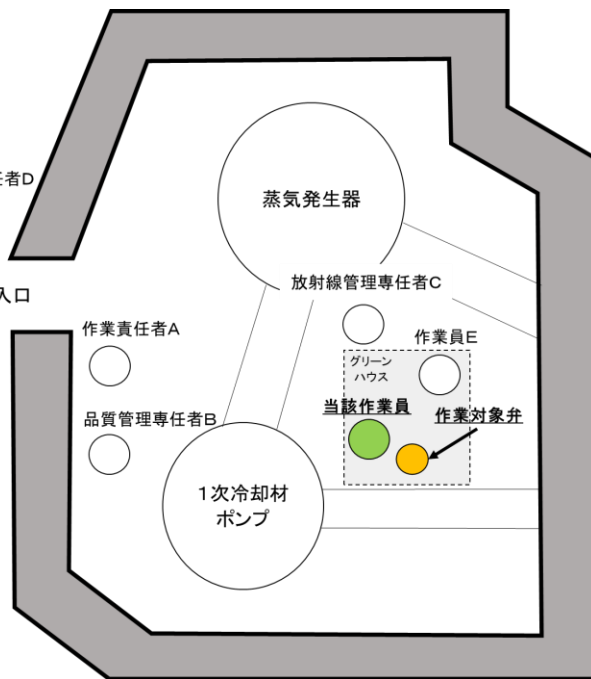

作業状況



グリーンハウス

グリーンハウス※内にて
弁の点検作業を実施

グリーンハウス内での作業風景

当該弁



当該作業員

エアラインマスク
着用のイメージ



※原子炉施設内などで放射能汚染した機器や装置の分解・点検・補修などの作業を行うときに、汚染を他の区域に広げないように設置する組立式の部屋

- ・当該作業員はグリーンハウス内において、当日の午後、約3時間10分、1次系大型弁から約0.5m離れた位置で分解点検を実施していた。
- ・作業終了後、作業計画線量値の0.90mSvを超える1.81mSvの線量を確認した。
