


図 - 6 中央制御室への蒸気流入に係る点検

点検概要


美浜発電所3号機2次系配管破損事故において、中央制御室につながるケーブルトレイ及び電線管の壁貫通部等のシール施工が不適切であったため、中央制御室への蒸気浸入が認められたことを踏まえて、中央制御室貫通部等のシール施工状況を点検し、不適切な箇所については補修を行う。

点検箇所概要図

[建屋側面図]

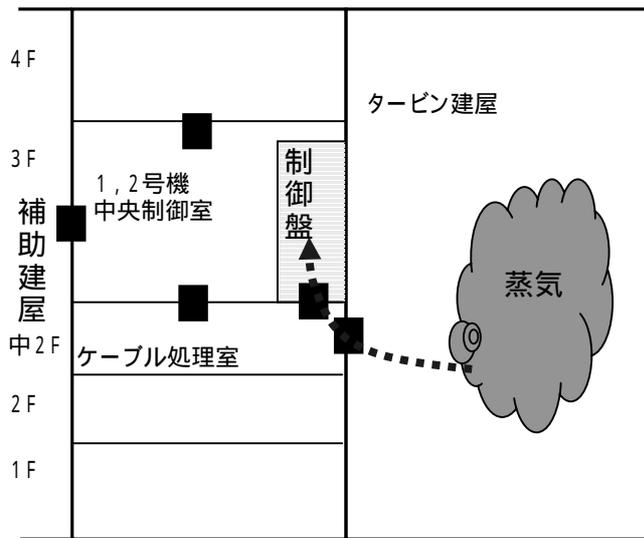

[建屋平面図]

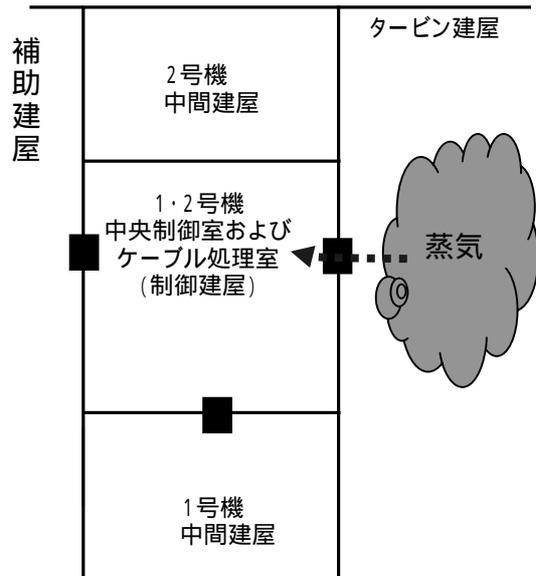


■ : 貫通部点検箇所

←.....: 美浜3号機事故時の蒸気の流入経路(例)

貫通部の点検例

壁貫通部の点検

各建屋からケーブル処理室への壁貫通部
目視点検箇所のイメージ

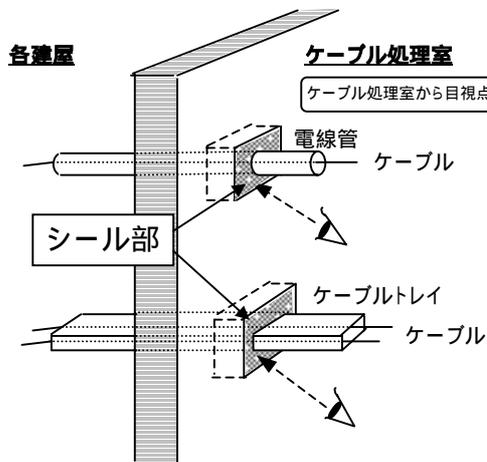

床貫通部の点検

ケーブル処理室から中央制御室制御盤への床貫通部
目視点検箇所のイメージ

