


大飯発電所2号機

A, Bタービン動主給水ポンプ吐出圧力計取出し配管溶接部の補修について

補修概要

系統概要図

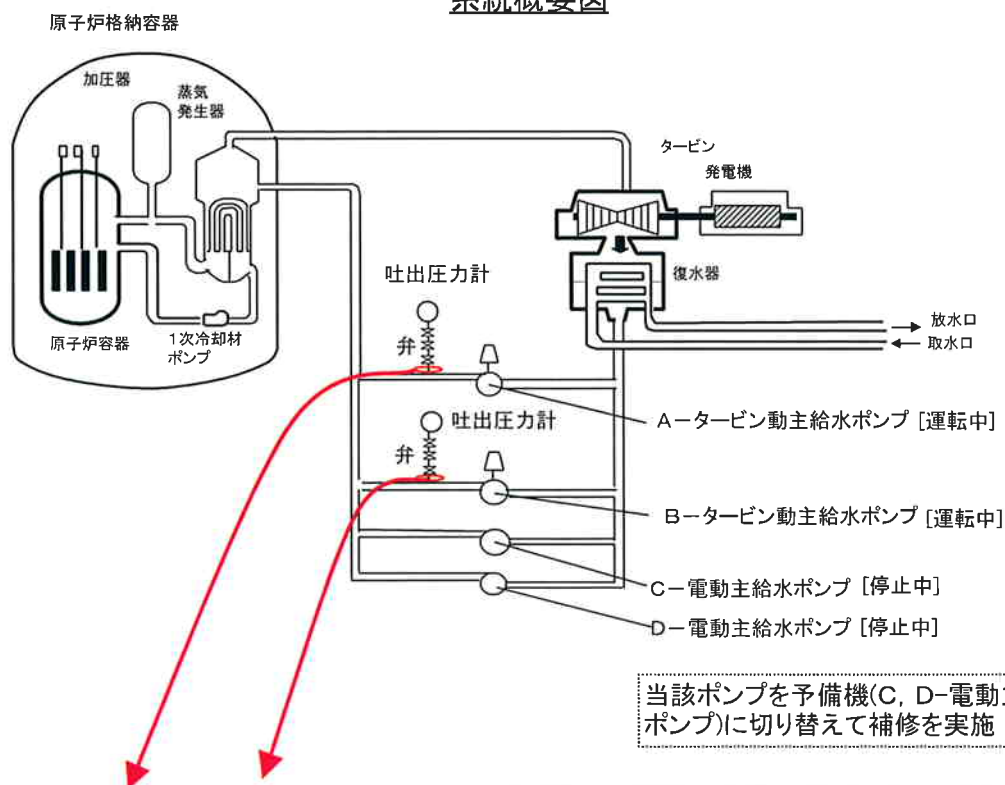

溶接作業における熱処理に不備があったことから、溶接部を一旦切断し、再度溶接を実施

最高使用温度: 195℃
最高使用圧力: 約12.3MPa

