


### 高浜発電所2号機 第24回定期検査の作業工程

定期検査は、平成19年8月17日から約11ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施しています。

(平成20年6月5日現在)

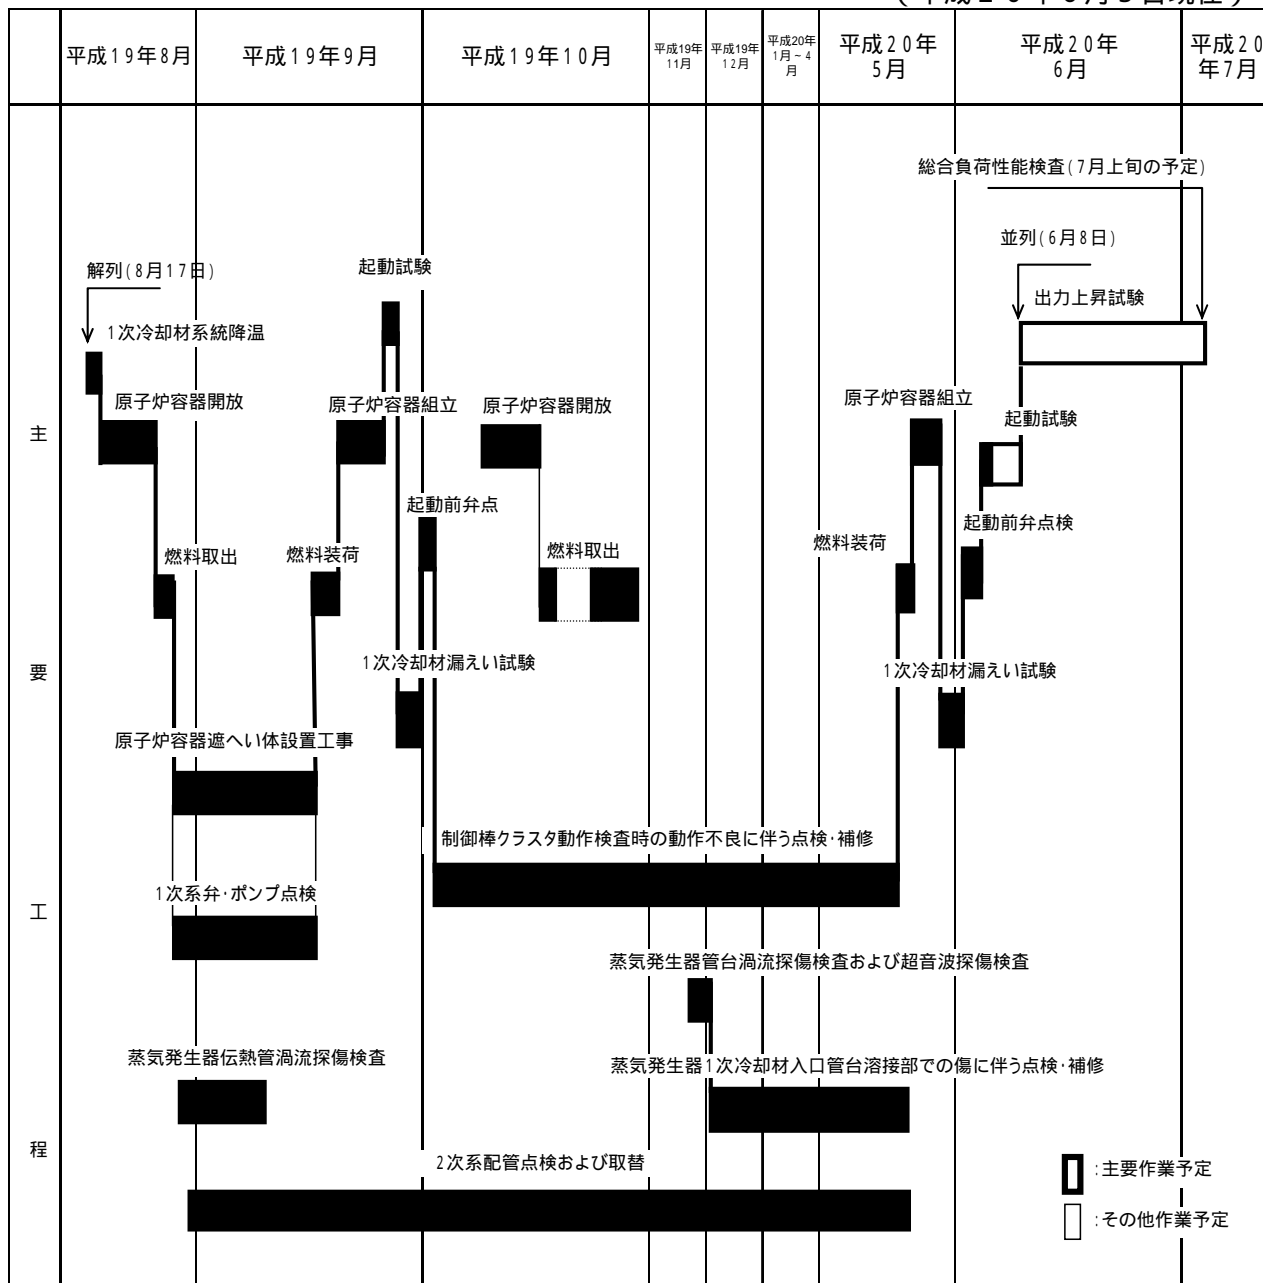

: 黒塗りは実績を示す。

(参考) 高経年化対策として実施する主な作業

#### 燃料取換クレーン他ロッキングカム検査

燃料取換クレーンおよび燃料ピットクレーンにおいて、燃料をつかむフィンガはロッキングカムとの連携により作動するが、連携部分(摺動部)はこすれにより摩耗する可能性があるため、フィンガとロッキングカムとの隙間計測を行い、これらの機能に係る健全性を確認した。
