

美浜発電所および高浜発電所における排気管かさ上げ工事の概要

工事件名	工事箇所	排気口の地表上の高さ		吸気口の地表上の高さ		津波想定高さ (+9.5m)	工事期間(着工~竣工)
		変更前	変更後	変更前	変更後		
美浜発電所1号機ディーゼル消火ポンプ排気管かさ上げ工事	NO.1ディーゼル消火ポンプ	5.21m	8.00m	-	-	EL:11.1m	H23.10.17~H23.12.22
	NO.2ディーゼル消火ポンプ	(EL:8.71m)	(EL:11.50m)				
高浜発電所1号機ディーゼル消火ポンプ排気管かさ上げ工事	NO.1ディーゼル消火ポンプ	1.93m (EL:8.93m)	5.44m (EL:12.44m)	-	-	EL:10.8m	H23.3.25~H23.5.31
高浜発電所3号機非常用ディーゼル発電機排気管かさ上げ工事	A非常用DG	11.4m	20.7m	EL:5.77m	EL:19.3m		H24.2.6~H24.5.29
	B非常用DG	(EL:15.20m)	(EL:24.5m)				
高浜発電所4号機非常用ディーゼル発電機排気管かさ上げ工事	A非常用DG	11.7m	20.9m	EL:6.70m	EL:19.2m	H24.8.27~H25.1.31	
	B非常用DG	(EL:15.2m)	(EL:24.4m)				


美浜発電所1号機ディーゼル消火ポンプ排気管かさ上げ工事

改造前



排気口地表上の高さ:5.21m
(EL:8.71m)

改造後

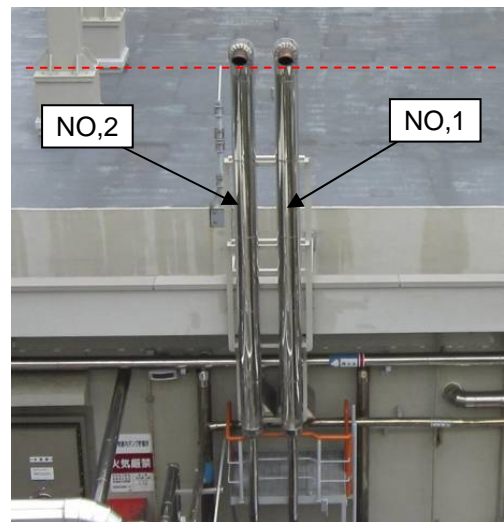

排気口地表上の高さ:8.00m
(EL:11.50m)

高浜発電所1号機ディーゼル消火ポンプ排気管かさ上げ工事

改造前



排気口地表上の高さ: 1.93m
(EL: 8.93m)

改造後



排気口地表上の高さ: 5.44m
(EL: 12.44m)

高浜発電所3、4号機ディーゼル発電機排気管かさ上げ工事


※写真は、3号機ディーゼル発電機排気管かさ上げ工事

改造前



排気口地表上の高さ: 11.4m
(EL: 15.2m)

改造後

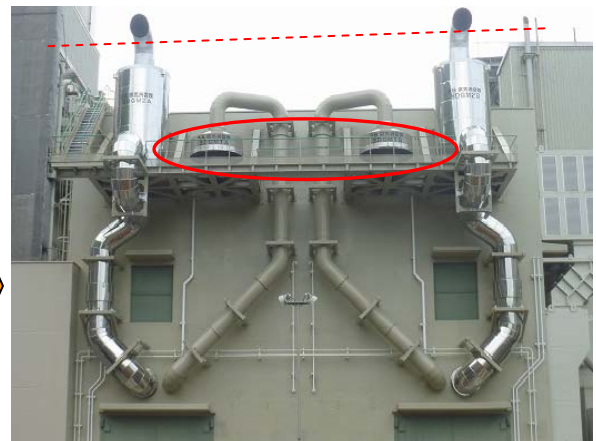

排気口地表上の高さ: 20.7m
(EL: 24.5m)
