


図1 - 5 主蒸気・主給水管ベローズ他取替工事

工事概要

第20回定期検査(平成15年度)において、主蒸気管・主給水管ベローズの外表面に軽微な錆が確認されたことから、当該ベローズを取り替えた。
また、第17回定期検査(平成11年度)に発生した水撃現象(ウォーターハンマー現象)の影響が考えられるA - 主蒸気系統配管の一部についても取り替えた。
ベローズ: 格納容器の配管貫通部などをシールする金属製の機器

取替箇所概略図

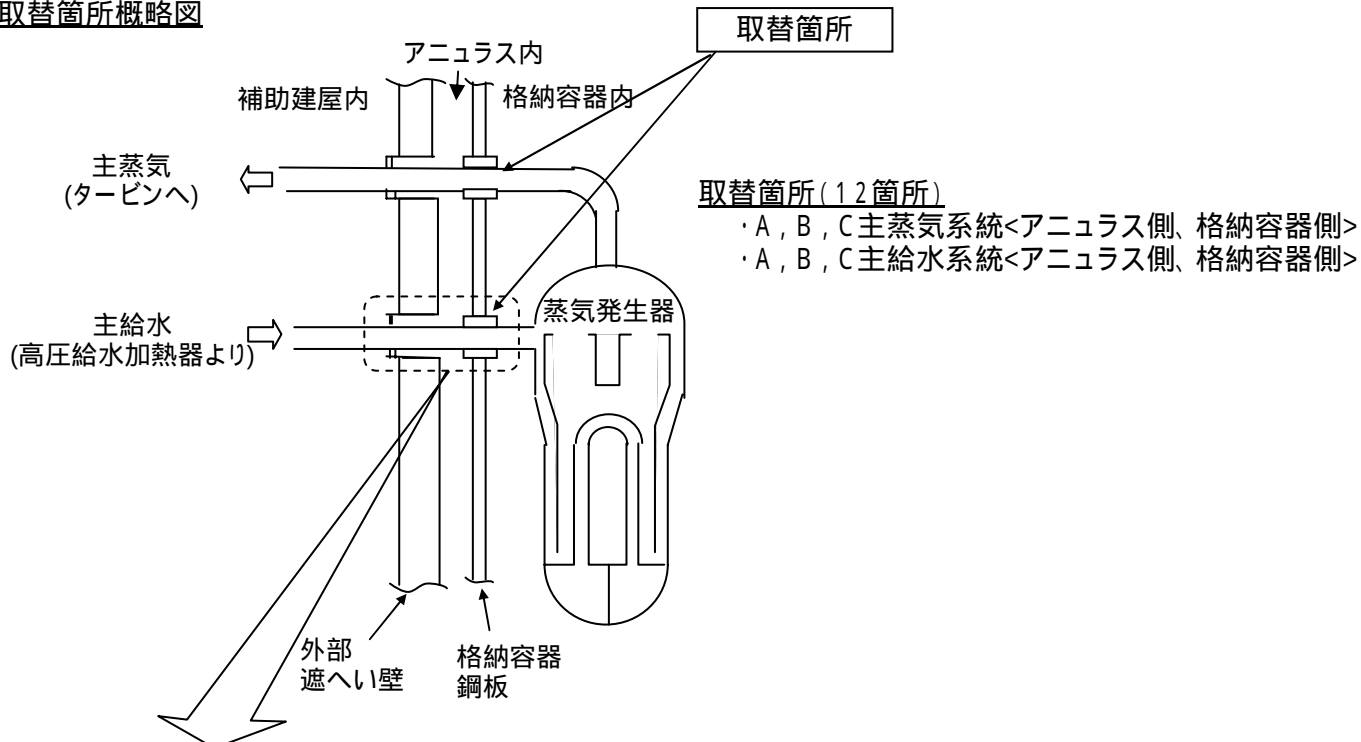

拡大図

A - 主給水管の例

