

図-1 2次系配管の点検等

点検概要

今定期検査において、合計797箇所について超音波検査（肉厚測定）を実施する。

○2次系配管の管理指針に基づく超音波検査（肉厚測定）部位


	「2次系配管肉厚の管理指針」の 点検対象部位	今回点検実施部位
主要点検部位	1,635	632
その他部位	1,331	165
合計	2,966	797


取替概要

○今後の保守性を考慮し、6箇所を耐食性の優れた低合金鋼の配管に取り替える。

系統別概略図

復水系統		主蒸気系統	
給水系統		ドレン系統	

 : 主な配管取替箇所

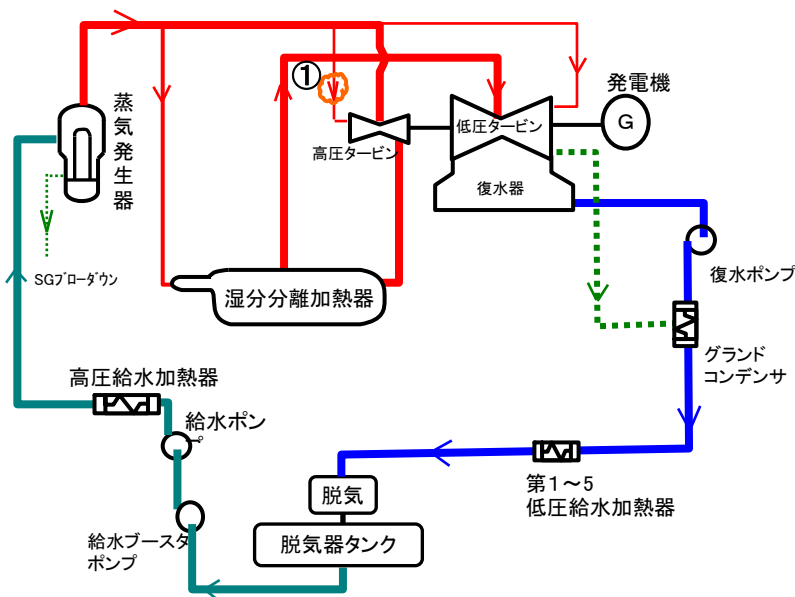

**【取替理由】**  
 ①配管の保守性<sup>\*</sup>を考慮して取り替える。  
 (6箇所)  
 炭素鋼 ⇒ 低合金鋼 6箇所

<sup>\*</sup> 狭隘部で肉厚測定がしづらい配管について取り替える。
