大飯発電所3号機　所内電源喪失に伴う非常用ディーゼル発電機の自動起動

事象概要

発生場所

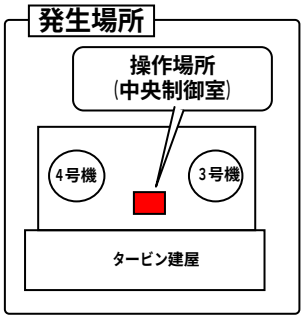

事象発生時

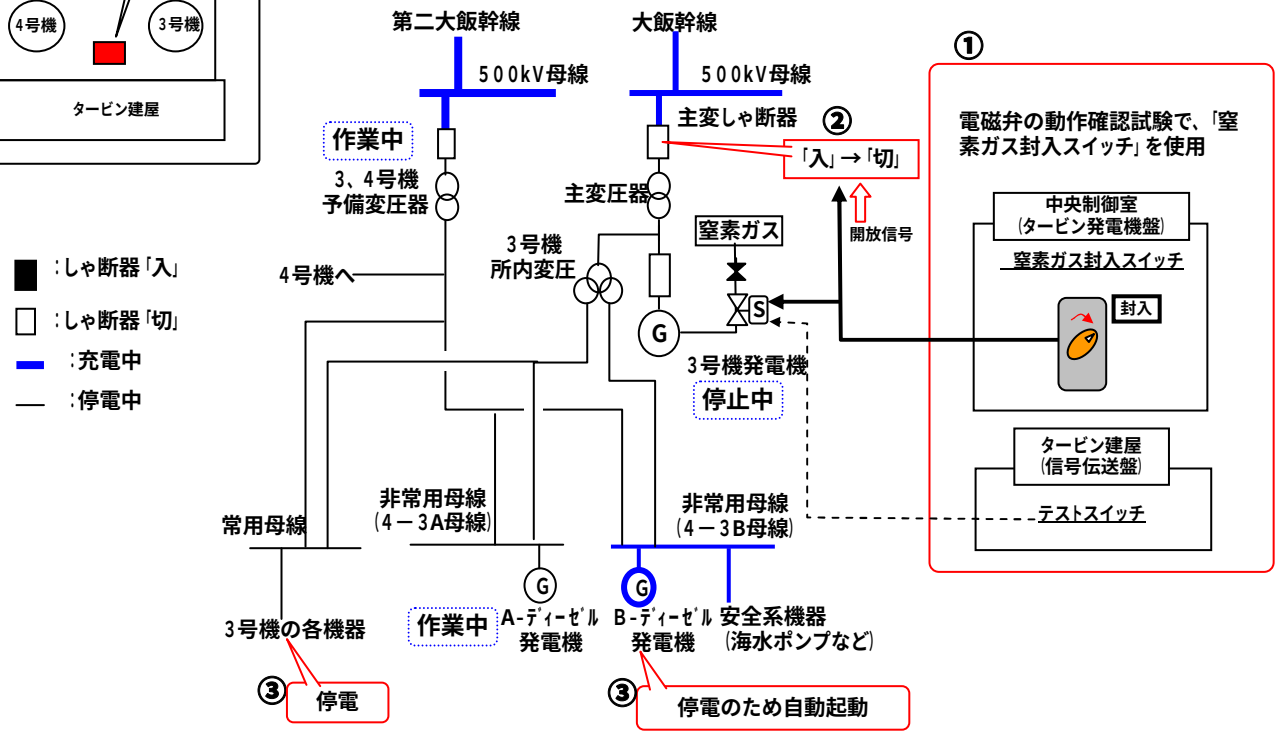

動作確認試験の実施状況

作業要領書
(作業手順)

「主変しゃ断器の開放信号を隔離する措置を行った上で、窒素ガス封入スイッチを操作する」手順となっていた。

問題点①

作業要領書が誤っており、主変しゃ断器の開放信号が発信しない「テストスイッチ」を操作する手順になっていなかった。

作業担当課員

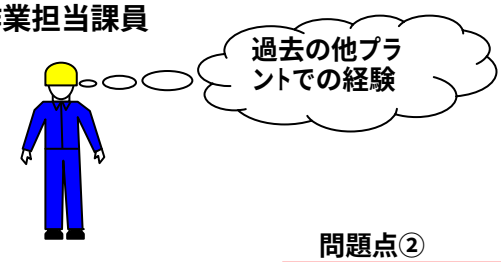

スイッチ操作の実施

問題点②

試験担当者は、過去の他プラントでの経験を基に、作業要領書を十分確認せずにスイッチ操作を行った。

主変しゃ断器の開放信号が発信
主変しゃ断器が開放
所内電源が喪失
