別　紙

高浜発電所２号機　第２５回定期検査の作業工程

平成２１年２月２５日から、以下の作業工程にて実施しています。

（平成２１年５月７日現在）

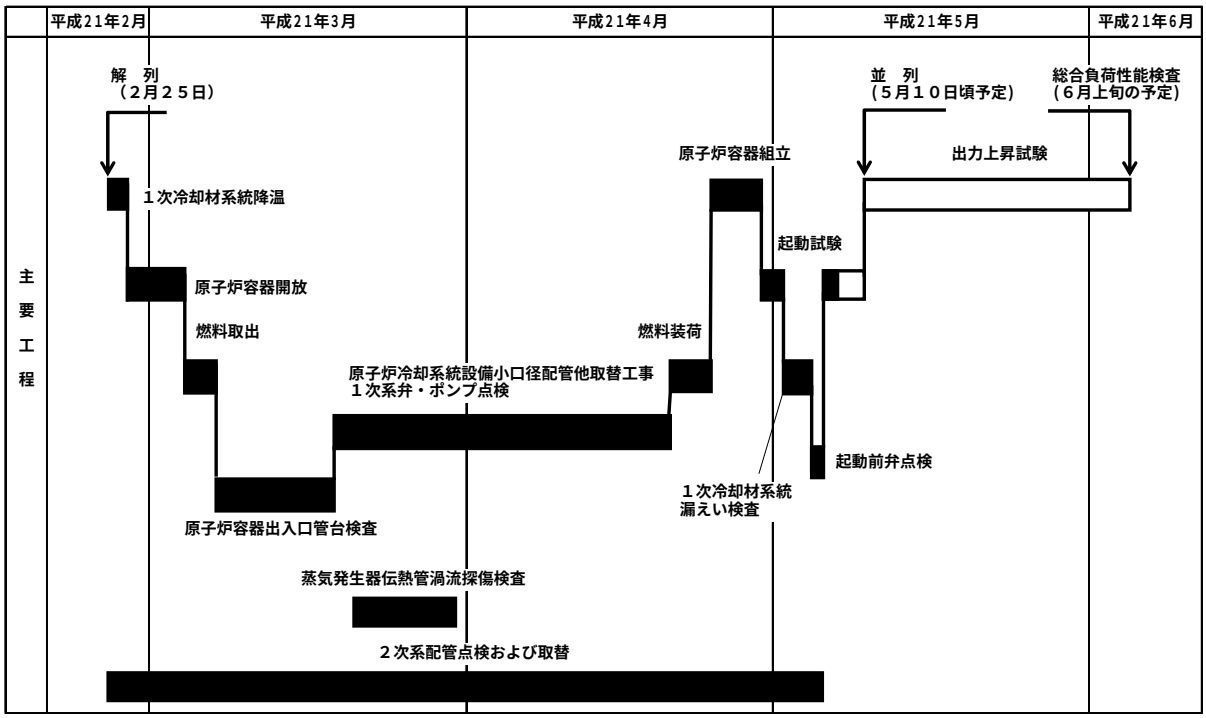

黒塗りは実績を表します。

（参考）高経年化対策として実施した主な作業

○６００系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れ事象を踏まえた予防保全工事

国内外ＰＷＲプラントにおける応力腐食割れ事象を踏まえ、６００系ニッケル基合金が使用されている蒸気発生器出口管台溶接部について渦流探傷試験を実施し、異常がないことを確認しました。

また、予防保全対策として、溶接部表面の残留応力を低減させるためショットピーニング工事を施工しました。

以上
