[添付資料]

角川発電所ダム放流警報線の一部除却工事における微量ＰＣＢ混入機器の不適切な処理概要

油入機器の除却工事における微量ＰＣＢ混入確認手順

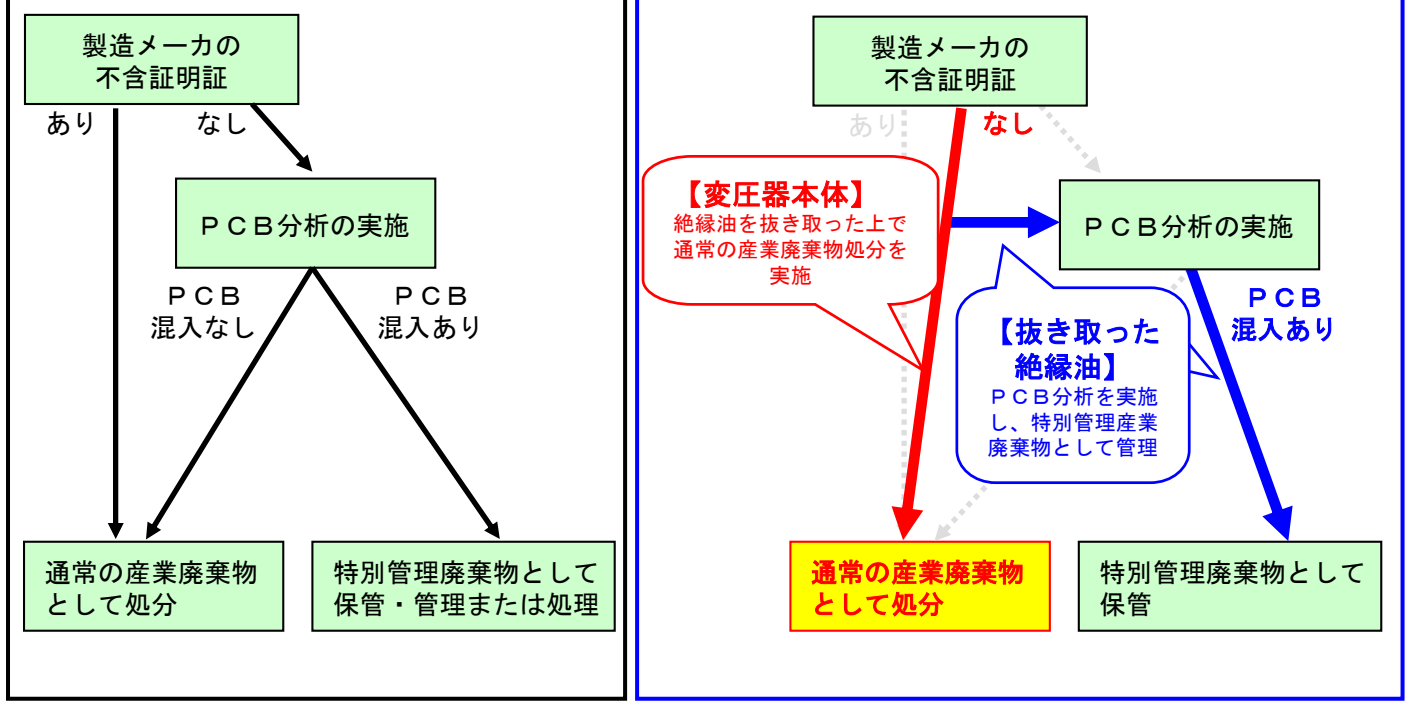

原　　因

・油入機器の除却時におけるＰＣＢに関する関係法令や社内ルールに基づくＰＣＢ混入の確認手順についての認識不足、チェック不足

再発防止対策

・本事象の周知徹底
・関係法令や社内ルールに関する研修によるＰＣＢ混入の確認手順に関する知識の向上
・法令手続き一覧表や工事発注書類にＰＣＢ分析結果を確認する項目を追加しチェックする仕組みの強化

角川発電所

所　在　地：岐阜県飛騨市河合町
運転開始日：昭和３０年４月
出　　力：２３，０００ｋＷ
形　　式：ダム水路式
河　川　名：神通川水系宮川
ダ　ム　名：角川ダム

変圧器

単　　相：３．３ｋＶ／２１０Ｖ
仕　　様：単相、６０Ｈｚ、２ｋＶＡ
寸　　法：Ｗ４７５×Ｄ４３５×Ｈ６６０（mm）
材　　質：鉄および銅など
重　　量：６０ｋｇ
製 造 年：１９８２年
